

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

บันทึกข้อความ

912 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ

จาก ผู้จัดการสำนักบ้านมั่นคง

กรุงเทพฯ 10240 ☎ 0-2378-8300-20 # 8752

ถึง ผอ./รอง.ผอ./ผช.ผอ./ผจก./หน. หน่วย

เรื่อง รายงานสถานะโครงการภาพรวมการอนุมัติ

ที่ นม 14/ 00045

การเบิกจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2560

วันที่ 9 มกราคม 2561

เรียน ผอ./รอง.ผอ./ผช.ผอ./ผอ.ภาค/สำนักนโยบายและแผน/สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่ คณะทำงานตัวชี้วัดฯ ได้กำหนดให้ฝ่ายเลขานุการโครงการทุกโครงการ จัดทำรายงานผลสถานะโครงการและงบประมาณประกอบด้วย ผลการอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการทุกโครงการ ความคืบหน้าการดำเนินงานในแต่ละโครงการ รวมถึงการวิเคราะห์กระบวนการโครงการเป็นรายเดือนและรายไตรมาส เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามและรายงานผลความคืบหน้าสถานะโครงการประกอบด้วย ผลการอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ความคืบหน้าการดำเนินงานในแต่ละโครงการ ผลการตรวจทานฐานข้อมูลในระบบ พร้อมทั้งข้อสังเกต ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงาน เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์ และระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานของสำนักงานปฏิบัติการภาค และนำไปสู่การพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายนั้น

ในการนี้ สำนักงานบ้านมั่นคง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสถานะโครงการประจำเดือน ธันวาคม 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลโครงการภาพรวมและข้อมูลสถานะโครงการจำแนกเป็นรายภาค ทั้ง 5 ภาค พร้อมทั้งข้อสังเกตโครงการที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้ประโยชน์ในการดำเนินงานและการติดตามรายงาน สำนักบ้านมั่นคงจึงขอจัดส่งรายงานสถานะโครงการดังนี้

1. รายงานสถานะการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคง
2. รายงานสถานะการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน ปี 2560,2561
3. รายงานสถานะการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยไฟไหม้ ไส้ร้อย ปี 2559 - 2561
4. รายงานสถานะการดำเนินงานโครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี 2560,2561

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวสุมล ยางสูง)
ผู้จัดการสำนักบ้านมั่นคง

รายงานสถานะของโครงการบ้านมั่นคง
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม 2560

รายงานสรุปผลการอนุมัติ กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ ปี 2561 (เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์)

ตามทิศทางการทำงานการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งเมือง ในการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงเกิดการสร้างเครือข่ายเมือง การพัฒนาความเข้มแข็งของขบวนเครือข่ายองค์กรชุมชน และการพัฒนาคุณภาพโครงการซึ่งมีเป้าหมายในการทำงานปี 2561 โดยมีเป้าหมายดำเนินการ 4,000 ครั้วเรือน ทั่วประเทศ ดังนั้นสำนักบ้านมั่นคง จึงได้รวบรวมผลการพิจารณาโครงการบ้านมั่นคง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สามารถอนุมัติโครงการจำนวน 8 โครงการ 6 จังหวัด 704 ครั้วเรือน จำแนกเป็น โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนแออัดภายในเมืองจำนวน 588 ครั้วเรือน โครงการที่ดินชนบท 116 ครั้วเรือน วงเงินงบประมาณรวม 43,790,550 บาท

มาตรฐานการบริหารโครงการ จากการบริหารโครงการที่ผ่านมา สถาบันฯ ได้มีการศึกษาและทบทวนกระบวนการ การบริหารโครงการในทุกขั้นตอน เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็น การประกันคุณภาพการดำเนินงานขององค์กรในการสนับสนุนองค์กรชุมชนและภาคีพัฒนาที่ได้รับการสนับสนุน โครงการและงบประมาณจากสถาบันฯ จึงได้มีการพัฒนามาตรฐานการบริหารโครงการ กองเลขาคโครงการ ร่วมกับกับสำนักงานภาคได้กำหนดระยะเวลาการบริหารโครงการ ด้านการอนุมัติโครงการและบันทึกในระบบ โปรแกรมบีมอส พบว่า ภาคได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบแล้วจำนวน 1 โครงการ 1 จังหวัด 92 ครั้วเรือน วงเงินอนุมัติ 4,715,000 บาท เครือข่ายสลัม 4 ภาค 1 จังหวัด 319 ครั้วเรือน วงเงิน 20,807,500 บาท สามารถ ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานระยะเวลา ภายใน 30 วันหลังจากโครงการผ่านการอนุมัติ ส่วนภาคเหนือและ ภาคกรุงเทพปริมณฑลและตะวันออก อยู่ระหว่างการดำเนินการ รายละเอียด ดังนี้

สรุปผลการอนุมัติโครงการบ้านมั่นคง เปรียบเทียบกับเป้าหมายผลลัพธ์ ปี 2561

ภาค	เป้าหมาย	ผลการอนุมัติตามมติคณะทำงานพัฒนาโครงการ/ คณะอนุกรรมการ					ผลการบันทึกในระบบโปรแกรม บีมอส (ตรวจเช็คใน ระบบ 9/1/61)				
		คก	จว.	โครงการ บ้าน มั่นคง เมือง	โครงการ บ้าน มั่นคง ชนบท	จำนวนเงิน	คก	จว.	โครงการ บ้านมั่นคง เมือง	โครงการ บ้านมั่นคง ชนบท	จำนวนเงิน
เหนือ	400	2	1	97	69	9,442,450					
อีสาน	400										
ใต้	400	1	1	92		4,715,000	1	1	92		4,715,000
กทม/ออก	400	3	3	80	47	8,825,000					
กลาง/ตก	400										
สำรวจ	2,000	2	1	319		20,807,500	2	1	319		20,807,500
รวม	4,000	8	6	588	116	43,790,550	3	2	411		25,522,500

หมายเหตุ โครงการปี 2561 เพิ่งได้รับการพิจารณาอนุมัติ ดังนั้นจึงอยู่ระหว่างกระบวนการบันทึกข้อมูลโครงการเข้าระบบ จึงยังไม่มียอดการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการอนุมัติโครงการบ้านมั่นคง (งปพัฒนากระบวนเมือง) ภาพรวมการอนุมัติโครงการ สามารถสนับสนุนภาคีความร่วมมือในการทำงานจำนวน 10 โครงการ วงเงินอนุมัติ 5,153,300 บาท เบิกจ่ายงบประมาณแล้วจำนวน 1,265,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.55 คงเหลือรอเบิกจ่าย 3,987,680 บาท จำแนกรายภาคได้ดังนี้

ภาค	กรอบ งบประมาณ	งปพัฒนากระบวนเมือง (บ81214)				
		โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	คงเหลือรอเบิกจ่าย
เหนือ	2,000,000					
อีสาน	2,000,000					
ใต้	2,000,000					
กทม/ออก	2,000,000					
กลาง/ตก	2,000,000	1	300,600	201,220	66.94	99,380
ส่วนกลาง		9	4,485,700	964,400	19.87	3,888,300
รวม	10,000,000	10	5,153,300	1,265,000	24.55	3,987,680

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2560 (กลุ่มโครงการเดิม)
(งปสนับสนุนองค์กรชุมชนและงปสนับสนุนภาคีความร่วมมือ)

ปีงบประมาณ 2561 โครงการบ้านมั่นคงมีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมา จำนวน 721.44 ล้านบาท ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 สถาบันฯ ได้ตั้งเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสแรกไว้ ร้อยละ 35 ของยอดคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมา เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 252.50 ล้านบาท ซึ่งในแต่ละภาคได้จัดทำแผนการเบิกจ่ายภาพรวมงบประมาณไว้เพียง 29.38 ล้านบาท เป็นการประมาณการเบิกจ่ายน้อยกว่าเป้าหมายผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 31 ธันวาคม 2560 แต่ละภาคสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.01 ของเป้าหมายการเบิกจ่าย ($30.33 \times 100 / 252.50$ ล้านบาท) ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายงบประมาณที่ต่ำกว่าเป้าหมาย สามารถแยกเป็นรายภาคได้ ดังนี้

ภาค	ยอดคงเหลือ รอเบิก	ตัวชี้วัดไตรมาสแรก 35%	แผนการเบิกจ่าย ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			รวม เบิกจ่าย	ร้อยละเทียบกับ 35%
				ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม		
คลอง	271.72	95.10	2.21		4.10	11.47	15.57	16.37
ปทุมธานีโมเดล	12.72	4.45	0.23		0.28		0.28	6.29
เหนือ	91.72	32.10	0.63		-		-	-
ตะวันออกเฉียงเหนือ	153.55	53.74			-		-	-
ใต้	39.64	13.87	5.72		-	6.86	6.86	48.16
กลางและตะวันตก	45.59	15.96	12.04		0.30	0.85	0.30	1.88
กทม/ตะวันออก/ เจ้าพระยา	62.28	21.80	0.32		-		0.85	3.90
ส่วนกลาง (สลัม 4 ภาค)	44.21	15.47	8.23		5.48	0.99	6.47	41.82
รวม	721.44	252.50	29.38		10.16	20.17	30.33	12.01

รายงานสถานะของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน
ปีงบประมาณ 2561 เดือน ธันวาคม 2560

เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ได้กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 547 ครัวเรือน วงเงินรวมทั้งสิ้น 117,600,000.00 บาท สนับสนุนให้ดำเนินการสร้างศูนย์พักคนไร้บ้านจำนวน 3 ศูนย์ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และกรุงเทพมหานคร ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร แยกเป็นรายปีดังนี้

- **ปีงบประมาณ 2560** ได้รับจัดสรรงบประมาณรวม 52,300,000 บาท หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 5,230,000 บาท คงเหลืองบประมาณดำเนินการ 47,070,000 บาท สำนักบ้านมั่นคงสามารถอนุมัติโครงการเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนไร้บ้านรวมทั้งสิ้น 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์คนไร้บ้านจังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดขอนแก่น และ กทม. ได้แก่ ศูนย์พักคนไร้บ้าน รวมทั้งสิ้น 45,400,000 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 42,900,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.49 ของงบประมาณอนุมัติ ดังนี้

ภาค	ครัวเรือน	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ รอเบิก (ลบ)	เบิกจ่าย	คงเหลือรอเบิก
					ต.ค.-ธ.ค.	พ.ย.
เหนือ (ศูนย์คนไร้บ้าน เชียงใหม่)		26,400,000	24,000,000	2,400,000	2,400,000	-
อีสาน (ศูนย์คนไร้บ้าน ขอนแก่น)		16,500,000	16,500,000	-		-
กทม (ศูนย์พักคนไร้บ้าน)	25	2,500,000	-	2,500,000		2,500,000
รวม		45,400,000	40,500,000	4,900,000	2,400,000	

- **ปีงบประมาณ 2561** ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน จำนวน 2 ศูนย์ งบประมาณทั้งสิ้น 65,300,000 บาท หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 6,530,000 บาท ดังนั้นคงเหลืองบดำเนินการทั้งสิ้น 58,770,000 บาท ยังไม่มีผลการอนุมัติในเดือนธันวาคม 2560

รายงานสถานะของโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไลรื้อ ปีงบประมาณ 2561 เดือนธันวาคม 2560

เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ได้กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนรวมทั้งสิ้น 3,452 ครัวเรือน วงเงินรวม 62,137,500 บาท เกิดการสนับสนุนงบประมาณให้กับขบวนการองค์กรชุมชนในระดับชุมชน และสำนักงานภาคจะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณรายโครงการ โดยครอบคลุมเป้าหมายครัวเรือนตามงบประมาณเงินขอและกรอบระยะเวลาดำเนินการ มีรายละเอียดดังนี้

**เงินขอและกรอบระยะเวลาดำเนินการ
โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวกรณีไฟไหม้ ไลรื้อ**

ทุกโครงการมีระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี กรณีหากมีข้อติดขัดไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน องค์กรผู้ดำเนินโครงการสามารถขอขยายระยะเวลาดำเนินการได้ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันสิ้นสุดโครงการหากเกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าว

กรอบงบดำเนินการปี 2561

ปีงบประมาณ	รหัส งบประมาณ	เป้าหมาย ครัวเรือน	วงเงินงบประมาณ	ดำเนินการแล้ว ปี 2559-2560	งบดำเนินการ ปี 2561
ปี 2559	84400	1,170	21,060,000	7,617,000	13,443,000
ปี 2560	84500	1,082	19,477,500	7,709,750	11,767,750
ปี 2561	84800	1,200			21,600,000
รวมทั้งสิ้น		3,452	40,537,500	15,326,750	46,810,750

จัดการเรื่องเอกสารแผนงาน
แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย /
ความจำเป็นระบบบริหารจัดการ/กติกาดำเนินการใช้
บ้านชั่วคราว

จัดทำบันทึกความเห็น
เสนอผู้อำนวยการผ่าน
สำนักบ้านมั่นคง
-บันทึกฐานข้อมูลใน
ระบบปฏิบัติการบ้านมั่นคง
BMOS
-จัดทำหนังสือแจ้งผลการ
อนุมัติ/แบบแปลนผลการ
อนุมัติ/การเบิกจ่าย
งบประมาณ

จัดการความกังวลพร้อม
เสนอผู้รับผู้ดำเนินการที่
ทำใบขออนุมัติฯ เพื่อ
ผู้สนับสนุนการพิจารณา
อนุมัติ
-แจ้งผลการอนุมัติให้
สำนักงานภาคทราบและ
ดำเนินการต่อไป
-รายงานผลการพิจารณา
อนุมัติให้คณะกรรมการ
บ้านมั่นคงและที่ดินทราบ

กลุ่มเป้าหมาย → ชุมชนที่ประสบภัยพิบัติ ที่ส่งผลให้บ้านเรือนเสียหาย ไฟไหม้ ไลรื้อ หรือชุมชนที่จำเป็นต้องย้ายเพื่อสร้างชุมชนใหม่ ทั่วประเทศ

เกณฑ์การพิจารณา →

1. ชุมชนที่ประสบภัยพิบัติ ที่ส่งผลให้บ้านเรือนเสียหาย ไฟไหม้ ไลรื้อ หรือชุมชนที่จำเป็นต้องย้ายเพื่อสร้างชุมชนใหม่
2. มีแผนการแก้ไขปัญหาคืออยู่อาศัย กติกาการอยู่ร่วมกัน รวมถึงการบริหารจัดการบ้านพักชั่วคราว
3. เป็นการก่อสร้างที่อยู่อาศัยชั่วคราว หรือเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับการการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยถาวร โดยมีหลักฐานการดำเนินการ เช่น ใบเสร็จค่าเช่าบ้าน

ทั้งนี้ ไม่สามารถนำไปใช้ช่วยเหลือเชิง สงเคราะห์ให้กับผู้ประสบภัยในลักษณะเบียดเบียน

องค์กรผู้ดำเนินโครงการต้องเสนอเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 1 ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติโครงการ หากไม่มีการดำเนินการ สถาบันจะมีมติพิจารณาทบทวนโครงการและงบประมาณ โดยอาจพิจารณายุติการให้การสนับสนุน และหากสถาบันพิจารณายุติให้การสนับสนุน

รายงานสรุปผลการอนุมัติ กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ ปี 2561

ผลการอนุมัติโครงการปี 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถอนุมัติโครงการแก้ไขปัญหาด้านพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว จำนวน 892 ครัวเรือน วงเงินงบประมาณ 6,183,447 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2560 (กลุ่มโครงการเดิม)


กลุ่มปี 2559 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 มีงบคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมา จำนวน 3,006,000 บาท ซึ่งในเดือน ธันวาคม 2560 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 2,970,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 98 คงเหลือรอเบิกจ่ายจำนวน 36,000 บาท

กลุ่มปี 2560 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 มีงบคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมา จำนวน 2,018,000 บาท ซึ่งในเดือน ธันวาคม 2560 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 914,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.29 คงเหลือรอเบิกจ่ายจำนวน 1,104,000 บาท

รายงานสถานะของโครงการบ้านพอเพียงชนบท

ปีงบประมาณ 2561 เดือน ธันวาคม 2560

เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ได้กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 15,000 ครัวเรือน วงเงินรวม 337,500,000 บาท (สามร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 33,750,000 บาท (สามสิบล้านสามหมื่นเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือดำเนินการ 303,750,000 บาท (สามร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) มีกรอบงบประมาณที่กระจายในแต่ละภาคดังนี้

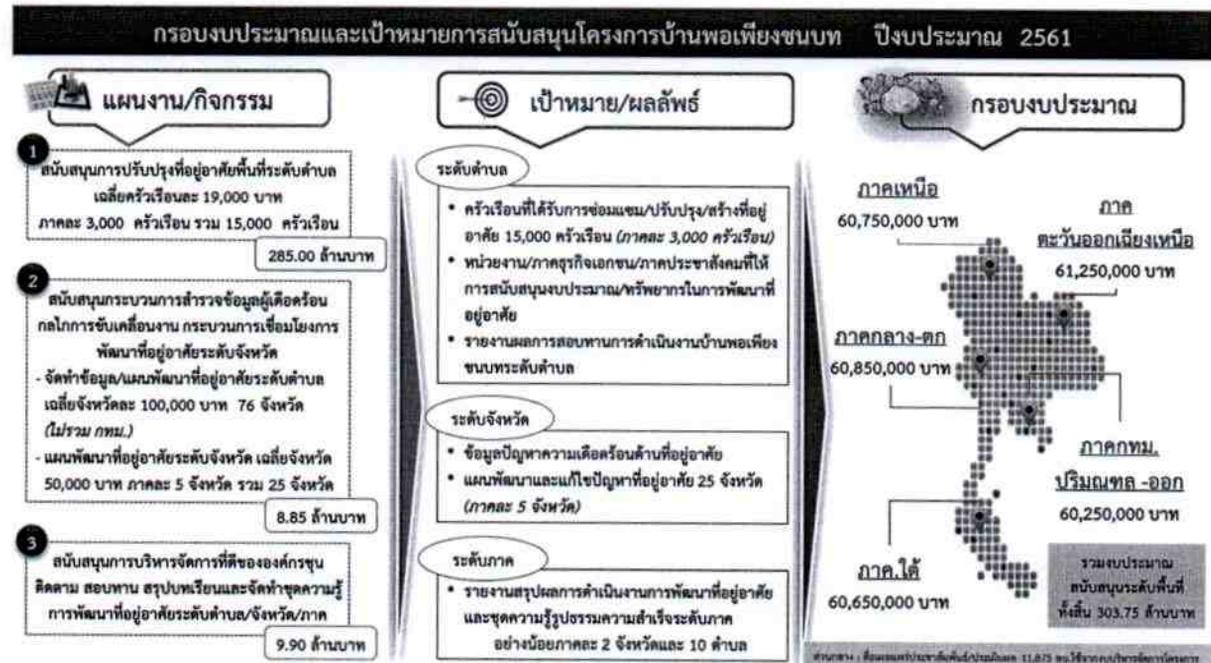

รายงานสรุปผลการอนุมัติ กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ ปี 2561 (เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์)

โครงการบ้านพอเพียงชนบท ได้รับการพิจารณาโครงการแล้วทั้งสิ้น 874 โครงการ 40 จังหวัด 786 ตำบล 9,085 ครัวเรือน วงเงินอนุมัติจำนวน 165,666,455 บาท จำแนกรายภาคดังนี้

ข้อสังเกต จากการสอบทานระบบโปรแกรมบีมอส พบว่าสำนักงานภาคสามารถบันทึกข้อมูลโครงการบ้านพอเพียงชนบท จำนวน 577 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66 ของโครงการที่อนุมัติ จำแนกรายภาคได้ดังนี้

ภาค	เป้าหมาย	กรอบงบ	ผลการอนุมัติตามมติคณะทำงานพิจารณาโครงการภาค				
			โครงการ	จังหวัด	ตำบล	ครัวเรือน	จำนวนเงิน
ภาคเหนือ	3,000	60,750,000	344	11	326	*2,371	43,350,000
ภาคอีสาน	3,000	61,250,000					
ภาคใต้	3,000	60,650,000	63	7	47	1,190	2,5995,000
ภาคกทม/ออก	3,000	60,250,000	120	7	103	**2,081	39,380,000
ภาคกลาง/ตก	3,000	60,850,000	347	15	310	***3,443	56,941,455
รวม	15,000	303,750,000	874	40	786	9,085	165,666,455

สำนักงานภาคเหนือ บันทึกลงโครงการครบถ้วนแล้ว 100 % ปรากฏว่า จำนวนครัวเรือนที่อนุมัติ 2,371 ครัวเรือน ไม่ตรงกันกับครัวเรือนที่บันทึกในระบบ คือ 2,402 ครัวเรือน มีผลต่าง จำนวน 31 ครัวเรือน

ภาคกลางและตะวันตก อยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูลโครงการ จำนวนครัวเรือนที่อนุมัติ 3,443 ครัวเรือน เมื่อเทียบผลการบันทึกในระบบโปรแกรม พบว่าจำนวนครัวเรือนรวม 90,434 ครัวเรือน ซึ่งบันทึกเกินกว่า ครัวเรือนที่อนุมัติจริง

ภาคทท/ตะวันออก บันทึกลงโครงการครบถ้วนแล้ว 100 % ปรากฏว่า จำนวนครัวเรือนที่อนุมัติ 2,081 ครัวเรือน ไม่ตรงกันกับครัวเรือนที่บันทึกในระบบ คือ 2,079 ครัวเรือน มีผลต่าง จำนวน 2 ครัวเรือน

ผลการบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรมบีมอส					
ภาค	โครงการ	จังหวัด	ตำบล	ครัวเรือน	จำนวนเงิน
ภาคเหนือ	344	14	316	*2,402	43,255,000
ภาคอีสาน	8	1	8	132	13,221,052
ภาคใต้	9	6	9	-	-
ภาคทท/ออก	103	7	97	**2,079	36,612,000
ภาคกลาง/ตท	113	12	82	***90,434	13,221,052
รวม	577	40	512	95,047	106,309,104

จากการบริหารโครงการที่ผ่านมา สถาบันฯ ได้มีการศึกษาและทบทวนกระบวนการ การบริหารโครงการ ในทุกขั้นตอน เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นการประกันคุณภาพการดำเนินงาน ขององค์กรในการสนับสนุนองค์กรชุมชนและภาคีพัฒนาที่ได้รับการสนับสนุนโครงการและงบประมาณจาก สถาบันฯ จึงได้มีการพัฒนามาตรฐานการบริหารโครงการ กองเลขาคโครงการร่วมกับสำนักงานภาคได้กำหนด ระยะเวลาการบริหารโครงการ ด้านการอนุมัติโครงการและบันทึกในระบบโปรแกรมบีมอส พบว่า สำนักงานภาค สามารถดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานระยะเวลา ภายใน 30 วันหลังจากโครงการผ่านการอนุมัติ รายละเอียด ดังนี้

สรุประยะเวลาการบริหารโครงการบ้านพอเพียงชนบท ด้านอนุมัติโครงการและบันทึกใบเบิกในบีมอส ในแต่ละภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 1

ณ 31 ธ.ค 2560 ภาค	จำนวน ตำบล	ตามเกณฑ์ระยะเวลา (30 วัน)			มากกว่าเกณฑ์			จำนวนวัน เฉลี่ย
		จำนวนตำบล	วันเฉลี่ย	ร้อยละของ จน.โครงการ	จำนวนโครงการ	วันเฉลี่ย	ร้อยละของ จน.โครงการ	
เหนือ (อนุมัติ 26/12/60 บันทึก 3/1/61)	316	316	8 วัน	100				
ตะวันออกเฉียงเหนือ	-	-	-	-				
ใต้ (อนุมัติ..... บันทึก 27/12/60)	63	9		14.29				
กลางและตะวันตก (อนุมัติ 4/1/61 บันทึก 9/1/61)	310	113	5 วัน	36.45				
กทม.ปริมณฑลและตะวันออก (บันทึก 15/12/60 อนุมัติ 22/12/60)	103	103	ก่อนเสนอโครงการ 7 วัน	100				
เนื่องจากทางภาคยังไม่ได้ส่งสำเนารายงานการประชม และผลการอนุมัติมาให้กองเลขา								
รวม	792	541	7 วัน	68.31				




ระยะเวลาการบริหารโครงการบ้านพอเพียงชนบทด้านการเบิกจ่ายและบันทึกใบเบิกในโปรแกรมบีมอส จากการสอบถามพบว่าเนื่องจากโครงการเพิ่งผ่านการอนุมัติ และอยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูลโครงการ ดังนั้นจึงไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณในเดือน ธันวาคม 2560

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2560 (กลุ่มโครงการเดิม)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มโครงการเดิม มียอดคงเหลือยกมา 3,681,096 บาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้กับองค์กรชุมชนได้จำนวนรวมทั้งสิ้น 3,477,096 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.46 เมื่อเทียบกับยอดคงเหลือยกมา และมีงบประมาณคงเหลือไม่ประสงค์จะเบิกจ่ายและขอปิดโครงการจำนวน 204,000 บาท จำแนกรายภาคได้ดังนี้

สรุประยะเวลาการบริหารโครงการบ้านพอเพียงชนบทด้านการเบิกจ่ายและบันทึกในบีมอส ในแต่ละภาค ประจำปีงบประมาณ 2561 กลุ่มโครงการเดิมยกมาจากปี 2560

ภาค	ยอดคงเหลือ ระเบิก (ลบ)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ย.	
เหนือ	54,000.00	-	-											
ตะวันออกเฉียงเหนือ	2,279,696.00	-		1,709,986										2,679,696
ใต้	495,000.00		969,710.00											495,000.00
กทม.ปริมณฑลและตะวันออก	302,400.00	-		81,000										302,400
ส่วนกลาง	150,000.00	-	221,400.00											
รวม	3,681,096.00	-	1,686,110	1,790,986										3,477,096.00



รายงานสถานะการดำเนินโครงการซ่อมสร้าง (กลุ่มโครงการเดิม)

ผลการดำเนินการซ่อมสร้างแล้วเสร็จ จากพื้นที่ที่รับการสนับสนุน จำนวน 10,369 ครัวเรือน จากรายงานผลการบันทึกรายงานความก้าวหน้าโครงการในระบบโปรแกรมบีมอส สามารถจำแนกเป็น 5 สถานะ ดังนี้

1. ดำเนินการซ่อมสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 5,631 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 54.31
2. ดำเนินการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่แล้วเสร็จ จำนวน 362 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 3.49
3. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1,012 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 6.76
4. ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 2,680 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 25.85
5. ยังไม่รายงานผล จำนวน 1,046 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 10.09

การรายงานความก้าวหน้าโครงการและการปิดโครงการ จำนวนรวมทั้งสิ้น 729 ตำบล รายงานความก้าวหน้างวดที่ 1 โครงการที่รับการสนับสนุนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 729 ตำบล สามารถรายงานความก้าวหน้าแล้วจำนวน 614 ตำบล คงเหลือยังไม่ดำเนินการจำนวน 115 ตำบล รายงานความก้าวหน้างวดที่ 2 สามารถรายงานความก้าวหน้าแล้วจำนวน 85 ตำบล คงเหลือยังไม่ดำเนินการจำนวน 644 ตำบล สำนักงานภาคจะต้องติดตามให้เกิดการรายงานผลพร้อมทั้งดำเนินการปิดโครงการต่อไป

รายงานการปิดโครงการ สำนักงานภาคเหนือมีหนังสือแจ้งปิดโครงการแล้วจำนวน 60 ตำบล และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีหนังสือแจ้งปิดโครงการแล้วจำนวน 7 ตำบล รายละเอียดดังนี้

โครงการบ้านพอเพียงชนบท ประจำปี 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (รายงานสถานะการดำเนินงานซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัย/การบันทึกความก้าวหน้าโครงการ/ปิดโครงการ)

ภาค	ผลการอนุมัติ				รายงานสถานะการดำเนินงาน				รายงานความก้าวหน้าปิดโครงการ		
	จำนวนโครงการ	จำนวนตำบล	จำนวนจังหวัด	ผู้รับผลประโยชน์ทั้งหมด	ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงเสร็จแล้ว	ดำเนินการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	รายงานความก้าวหน้างวด 1	รายงานความก้าวหน้างวด 2	ปิดโครงการ
ภาคเหนือ	277	261	15	2,061	1,280	95	177	1,315	199	52	60
ภาคอีสาน	174	169	19	2,070	950	59	96	398	121	1	7
ภาคใต้	67	66	14	2,077	1,078	98	469	364	63	1	
ภาคกทม/ชก	59	57	10	2,000	1,032	47	136	480	51	16	
ภาคกลาง/คก	180	175	16	2,161	1,291	63	134	123	180	15	
รวม	758	729	75	10,369	5,631	362	1,012	2,680	614	85	67
