

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

บันทึกข้อความ

912 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ

จาก ผู้จัดการสำนักบ้านมั่นคง

กรุงเทพฯ 10240 ☎ 0-2378-8300-20 # 8752

ถึง ผอ./รอง.ผอ./ผช.ผอ./ผจก./หน. หน่วย

เรื่อง รายงานสถานะโครงการภาพรวมการอนุมัติ

ที่ บม 14/00376

การเบิกจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 6 มีนาคม 2561

เรียน ผอ./รอง.ผอ./ผช.ผอ./ผอ.ภาค/สำนักนโยบายและแผน/สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่ คณะทำงานตัวชี้วัดฯ ได้กำหนดให้ฝ่ายเลขานุการโครงการทุกโครงการ จัดทำรายงานผลสถานะโครงการและงบประมาณประกอบด้วย ผลการอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการทุกโครงการ ความคืบหน้าการดำเนินงานในแต่ละโครงการ รวมถึงการวิเคราะห์กระบวนการโครงการเป็นรายเดือนและรายไตรมาส เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามและรายงานผลความคืบหน้าสถานะโครงการประกอบด้วย ผลการอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ความคืบหน้าการดำเนินงานในแต่ละโครงการ ผลการตรวจทานฐานข้อมูลในระบบ พร้อมทั้งข้อสังเกต ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงาน เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์ และระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานของสำนักงานปฏิบัติการภาค และนำไปสู่การพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายนั้น

ในการนี้ สำนักบ้านมั่นคง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสถานะโครงการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลโครงการภาพรวมและข้อมูลสถานะโครงการจำแนกเป็นรายภาค ทั้ง 5 ภาค พร้อมทั้งข้อสังเกตโครงการที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้ประโยชน์ในการดำเนินงานและการติดตามรายงาน สำนักบ้านมั่นคงจึงขอจัดส่งรายงานสถานะโครงการดังนี้

1. รายงานสถานะการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคง
2. รายงานสถานะการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน ปี 2560,2561
3. รายงานสถานะการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยไฟไหม้ ไส้ร้อย ปี 2559 - 2561
4. รายงานสถานะการดำเนินงานโครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี 2560,2561

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทิพวรรณ นันทิน

(นางทิพวรรณ นันทิน)

ผู้จัดการสำนักบ้านมั่นคง

**รายงานสถานะของโครงการบ้านมั่นคง, โครงการบ้านมั่นคงชนบท เปรียบเทียบเป้าหมาย
ผลลัพธ์ ปีงบประมาณ 2561 (ณ 28 กุมภาพันธ์ 2561)**

รายงานสรุปผลการอนุมัติ กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ ปี 2561 (เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์)

ตามทิศทางการทำงานการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งเมือง ในการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงเกิดการสร้าง
เครือข่ายเมือง การพัฒนาความเข้มแข็งของขบวนเครือข่ายองค์กรชุมชน และการพัฒนาคุณภาพโครงการซึ่งมี
เป้าหมายในการทำงานปี 2561 โดยมีเป้าหมายดำเนินการ 4,000 ครัวเรือน ทั่วประเทศ ดังนั้นสำนักบ้านมั่นคง
จึงได้รวบรวมผลการพิจารณาโครงการบ้านมั่นคง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สามารถอนุมัติโครงการ
จำนวน 8 โครงการ 6 จังหวัด 664 ครัวเรือน จำแนกเป็น โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนแออัด
ภายในเมือง จำนวน 548 ครัวเรือน โครงการที่ดินชนบท 116 ครัวเรือน วงเงินงบประมาณรวม 44,815,550 บาท
จำแนกรายภาคได้ดังนี้

สรุปผลการอนุมัติโครงการบ้านมั่นคง เปรียบเทียบกับเป้าหมายผลลัพธ์ ปี 2561


ภาค	เป้าหมาย	ผลการอนุมัติตามมติคณะทำงานพัฒนาโครงการ						ผลการอนุมัติงบประมาณระบวมเมือง				
		โครงการ	จังหวัด	เมือง (คร)	ชนบท(คร)	รวม	จำนวนเงิน	กรอบงบ	โครงการ	จำนวนเงิน	คงเหลืองบดำเนินการ	รวมอนุมัติ
ภาคเหนือ	400	2	1	97	69	166	9,442,450	2,000,000			2,000,000.00	9,442,450.00
ภาคอีสาน	400			-	-	-	-	2,000,000			2,000,000.00	-
ภาคใต้	400	1	1	92		92	4,715,000	2,000,000			2,000,000.00	4,715,000.00
ภาคทห/ออก/ เจ้าพระยา/ปทุมฯ	400	3	3	40	47	87	9,850,600	2,000,000	1	300,600	1,699,400.00	10,151,200.00
ภาคกลาง/ตก	400			-	-	-	-	2,000,000			2,000,000.00	-
กรอบสำรอง บมค	2,000	2	1	319		319	20,807,500	22,000,000	10	9,036,700	12,963,300.00	29,844,200.00
รวม	4,000	8	6	548	116	664	44,815,550	32,000,000	11	9,337,300	22,662,700	54,152,850.00

ผลการอนุมัติโครงการบ้านมั่นคง (งบพัฒนากระบวนเมือง) ภาพรวมการอนุมัติโครงการ
สามารถสนับสนุนภาคีความร่วมมือในการทำงานจำนวน 11 โครงการ วงเงินอนุมัติ 9,337,300 บาท
ประกอบด้วย โครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนบ่อฝรั่ง,ความร่วมมือพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการพัฒนาของรัฐ ภายใต้แผนพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี,โครงการวันที่อยู่อาศัยสากล ปี 2560
เครือข่ายสลัม 4 ภาค,สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล,คณะทำงานสอบทานงบประมาณ
โครงการบ้านมั่นคง ระดับเมือง/จังหวัด/ภาค,คณะทำงานโครงการการศึกษาแนวทางพัฒนาที่อยู่อาศัยของชุมชน
ริมคลองเปรมประชากร,กลุ่มเพื่อนเมือง,เครือข่ายสลัม 4 ภาค,คณะทำงานพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้และ
คณะทำงานโครงการภาคีการออกแบบที่อยู่อาศัยคลองบางซื่อ,โครงการพัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการที่ดิน
และที่อยู่อาศัย เสนอโดย เครือข่ายสลัม 4 ภาค

**รายงานภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบ้านมั่นคง เปรียบเทียบยอดคงเหลือ
รอเบิกจ่ายยกมาจากปีก่อนรวมกับโครงการที่ผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติประจำปี 2561**


ปีงบประมาณ 2561 โครงการบ้านมั่นคงมีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจาก
ปี 2560 จำนวน 721.44 ล้านบาท รวมกับงบสนับสนุนองค์กรชุมชนที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติใหม่ปี 2561
จำนวน 54.15 ล้านบาท รวมงบประมาณรอเบิกจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 775.59 ล้านบาท สามารถเบิกจ่าย

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 48.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.21 ของงบประมาณรอเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำแนกรายภาค
ได้ดังนี้

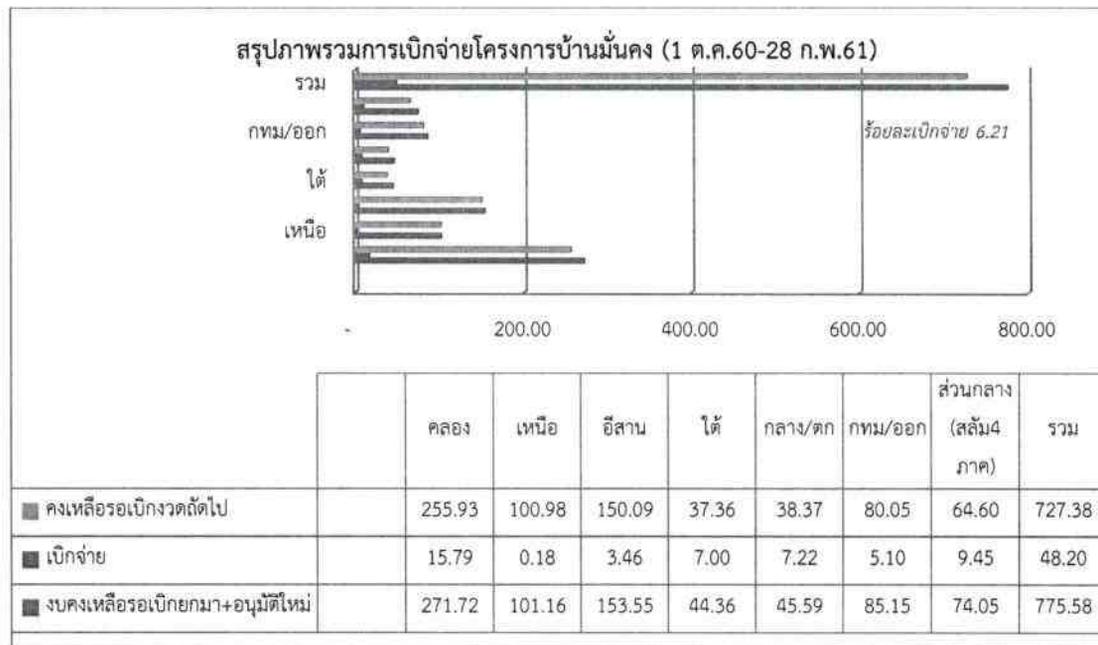


**รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 (กลุ่มโครงการเดิม)
(งบสนับสนุนองค์กรชุมชนและงบสนับสนุนภาคีความร่วมมือ)**

กลุ่มโครงการเดิม (งบสนับสนุนองค์กรชุมชนและงบสนับสนุนภาคีความร่วมมือ) มีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากปี 2560 จำนวน 721.44 ล้านบาท ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 สถาบันฯ ได้กำหนดตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพการเบิกจ่ายไว้ ร้อยละ 70 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2561 แต่ละภาคสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.32 ของยอดคงเหลือรอเบิกจ่ายซึ่งเป็นการเบิกจ่ายงบประมาณที่ต่ำกว่าเป้าหมาย คงเหลือรอเบิกจ่ายงวดถัดไป จำนวน 675.80 ล้านบาท สามารถแยกเป็นรายภาคได้ ดังนี้

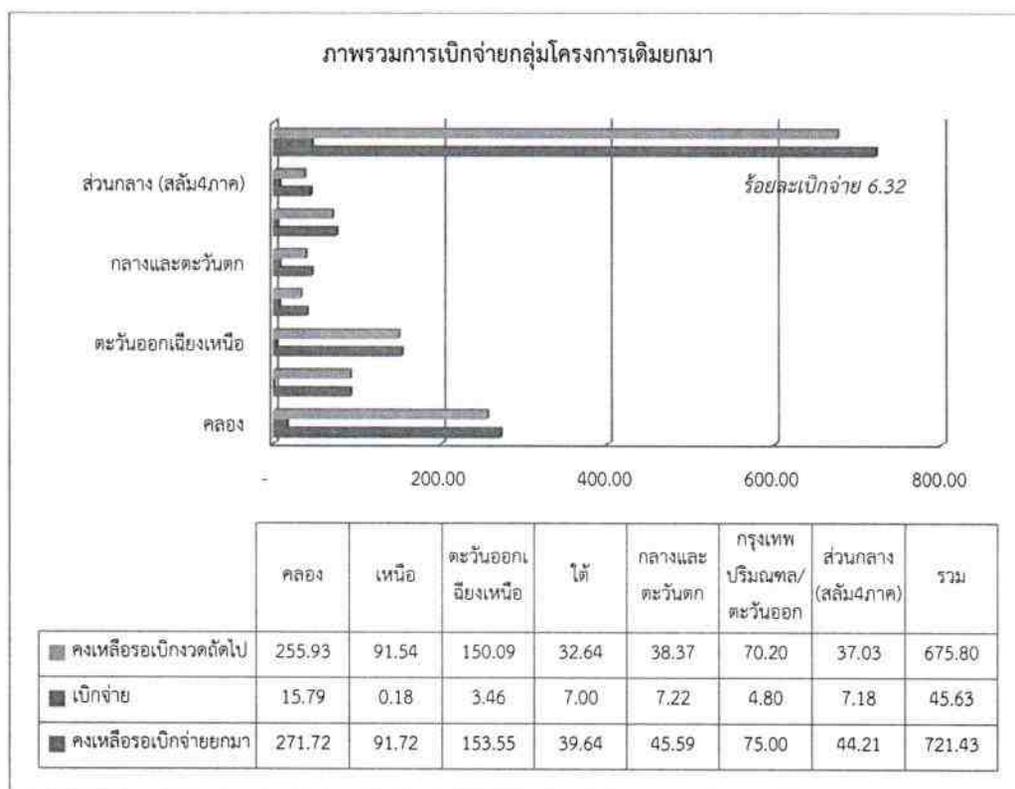

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 (กลุ่มโครงการที่อนุมัติใหม่ ปี 2561)

สถาบันฯ ได้กำหนดตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพการเบิกจ่ายไว้ ร้อยละ 50 โครงการบ้านมั่นคง ได้อนุมัติเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนจำนวน 8 โครงการ 664 คริวเรือน จำนวนเงิน 44.82 ล้านบาท และสนับสนุนภาคีความร่วมมือ (งปพัฒนากระบวนเมือง) จำนวน 11 โครงการ จำนวนเงิน 9.33 ล้านบาท รวมเป็นเงินอนุมัติทั้งสิ้น 54.16 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเพียง 2.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.75 ของจำนวนเงินอนุมัติรวมทั้งสิ้น จำแนกรายภาคได้ดังนี้

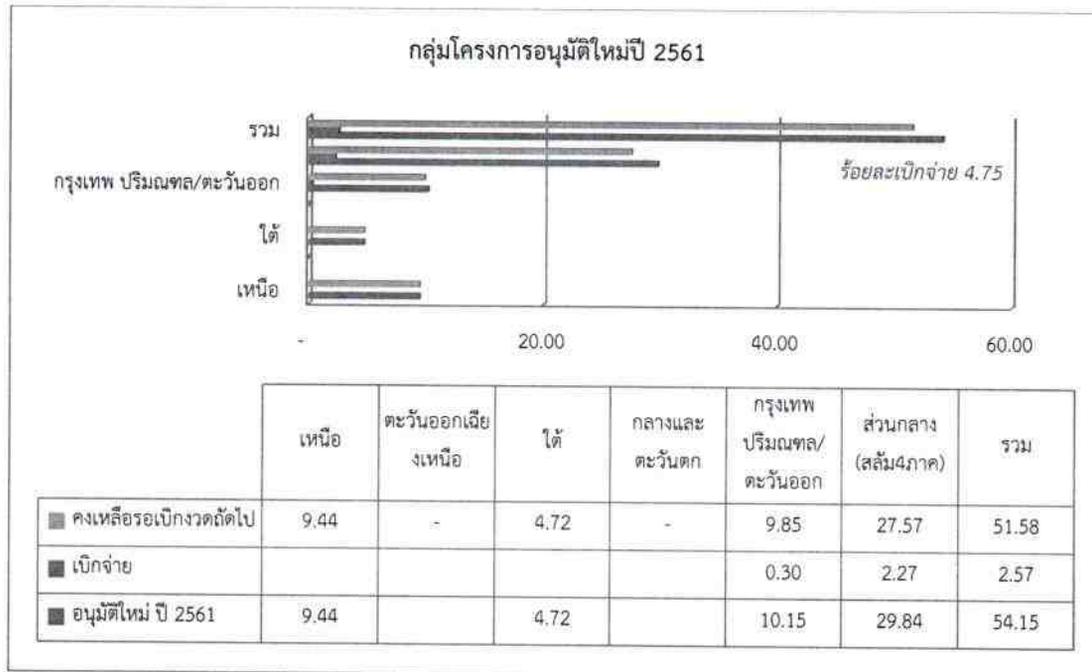

การดำเนินงานตามข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการ กองเลขาได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งงบบคงเหลือรอเบิกจ่ายให้แก่สำนักงานภาคตามที่คณะอนุกรรมการบ้านมั่นคงและการจัดการที่ดิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 วันที่ 30 มกราคม 2561 โดยให้สำนักงานภาคจัดทำหนังสือถึงเครือข่ายภาค เครือข่ายจังหวัด เครือข่ายเมือง และชุมชน เพื่อเป็นการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและหาสาเหตุของการที่ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ แจ้งให้ชุมชนดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงานโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด โดยให้สำนักงานภาคจัดทำแผนการเบิกจ่ายเป็นรายเดือน รายไตรมาส **ส่งให้กองเลขาภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561**

รายงานสถานะของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน ปีงบประมาณ 2561
ณ 28 กุมภาพันธ์ 2561

เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ได้กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 547 ครัวเรือน วงเงินรวมทั้งสิ้น 117,600,000.00 บาท สนับสนุนให้ดำเนินการสร้างศูนย์พักคนไร้บ้านจำนวน 3 ศูนย์ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และกรุงเทพมหานคร ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร แยกเป็นรายปีดังนี้

- ปีงบประมาณ 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณรวม 52,300,000 บาท หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 5,230,000 บาท คงเหลืองบประมาณดำเนินการ 47,070,000 บาท สำนักบ้านมั่นคง สามารถอนุมัติโครงการเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนไร้บ้านรวมทั้งสิ้น 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์คนไร้บ้านจังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดขอนแก่น รวมทั้งสิ้น 45,400,000 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 42,900,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณอนุมัติ ดังนี้

ภาค	ศูนย์	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ รอเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ
					28 ก.พ. 61	เบิกจ่าย
เหนือ (ศูนย์คนไร้บ้าน เชียงใหม่)	1	26,400,000	24,000,000	2,400,000	2,400,000	100%
อีสาน (ศูนย์คนไร้บ้าน ขอนแก่น)	1	16,500,000	16,500,000	-	-	100%
รวม	2	42,900,000	40,500,000	4,900,000	2,400,000	100%
คงเหลือดำเนินการ จำนวน 4,170,000 บาท						

- ปีงบประมาณ 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน จำนวน 2 ศูนย์ งบประมาณทั้งสิ้น 65,300,000 บาท หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 6,530,000 บาท ดังนั้น คงเหลืองบดำเนินการทั้งสิ้น 58,770,000 บาท สำนักบ้านมั่นคงสามารถอนุมัติโครงการเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนไร้บ้านรวมทั้งสิ้น 2 ศูนย์ ได้แก่ ชุมชนใหม่คนไร้บ้าน และสร้างศูนย์พักคนไร้บ้าน จ.ขอนแก่น งบประมาณอนุมัติรวม 12,757,600 บาท รายละเอียดดังนี้

องค์กรผู้เสนอ	ศูนย์	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ยอดคงเหลือรอเบิกจ่าย
ชุมชนใหม่คนไร้บ้าน	1	4,500,000	-	4,500,000
สมาคมคนไร้บ้าน : โครงการสร้างศูนย์ พักคนไร้บ้าน จังหวัดขอนแก่น	1	8,287,600	-	8,287,600
รวม	2	12,787,600	-	12,787,600
คงเหลือดำเนินการ 45,982,400 บาท				

รายงานสถานะของโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไลรีอ
ปีงบประมาณ 2561 เดือน กุมภาพันธ์ 2561

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไลรีอ ได้รับเงินงบประมาณจากรัฐตั้งแต่ปี 2559 - 2560 กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนรวมทั้งสิ้น 2,250 ครัวเรือน วงเงินรวม 40,537,500 บาท ในปีที่ผ่านมาเกิดการสนับสนุนงบประมาณให้กับขบวนองค์กรชุมชนในระดับชุมชน โดยสำนักงานภาคเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณรายโครงการ สามารถดำเนินการได้จำนวน 684 ครัวเรือน วงเงินอนุมัติรวม 11,273,000 บาท ยังเหลือเป้าหมายดำเนินการอีก 1,568 ครัวเรือน มีงบประมาณคงเหลือในการดำเนินการตามแผนงานโครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 25,210,750 บาท ต่อมาในปี 2561 พอช.ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน 1,200 ครัวเรือน วงเงินงบประมาณรวม 21,600,000 บาท รวมเป้าหมายดำเนินการ 2,768 ครัวเรือน วงเงินงบประมาณดำเนินการ 46,810,750 บาท

ผลการอนุมัติโครงการปี 2561

ปีที่อนุมัติ	รหัส	ครัวเรือน	งบดำเนินการ ปี 2561	ผลการอนุมัติปี 2561		คงเหลือรออนุมัติ
				งบดำเนินงาน พอช	สนับสนุนองค์กร ชุมชน	
ปี 2559	84400	927	13,443,000.-	-	7,389,447.-	6,053,553.-
ปี 2560	84500	-	11,767,750.-	-	-	11,767,750.-
ปี 2561	84800	-	21,600,000.-	2,160,000.-	-	19,440,000.-
รวม		927	46,810,750.-	2,160,000.-	7,389,447.-	37,261,303.-

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม 2559 - 2561

ปีที่อนุมัติ	ครัวเรือนดำเนินการ	ภาพรวมการ อนุมัติสะสม	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือรอเบิกจ่าย
ปี 2559	27 โครงการ 1,266 ครัวเรือน	12,900,447.00	9,763,755.00	3,136,692.00
ปี 2560	12 โครงการ 377 ครัวเรือน	5,762,000.00	4,768,000.00	994,000.00
ปี 2561		-	-	-
รวม	1,611	18,662,447.00	14,531,755.00	4,130,692.00

รายงานสถานะของโครงการบ้านพอเพียงชนบท ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ได้กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 15,000 ครัวเรือน วงเงินรวม 337,500,000 บาท (สามร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ทักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 33,750,000 บาท (สามสิบล้านสามแสนเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือดำเนินการ 303,750,000 บาท (สามร้อยสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) มีกรอบงบประมาณที่กระจายในแต่ละภาคดังนี้

กรอบงบประมาณและเป้าหมายการสนับสนุนโครงการบ้านพอเพียงชนบท ปีงบประมาณ 2561

แผนงาน/กิจกรรม

- 1** สนับสนุนการปรับปรุงที่อยู่อาศัยที่ระดับตำบล เฉลี่ยครัวเรือนละ 19,000 บาท
ภาคละ 3,000 ครัวเรือน รวม 15,000 ครัวเรือน
285.00 ล้านบาท
- 2** สนับสนุนกระบวนการสำรวจข้อมูลผู้เดือดร้อน กลไกการขับเคลื่อนงาน กระบวนการเชื่อมโยงการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด
- จัดทำข้อมูล/แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับตำบล เฉลี่ยจังหวัดละ 100,000 บาท 76 จังหวัด (ไม่รวม กทม.)
- แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด เฉลี่ยจังหวัด 50,000 บาท ภาคละ 5 จังหวัด รวม 25 จังหวัด
8.85 ล้านบาท
- 3** สนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรชุมชน ติดตาม สอบทาน สรุปบทเรียนและจัดทำชุดความรู้ การพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับตำบล/จังหวัด/ภาค
9.90 ล้านบาท

เป้าหมาย/ผลลัพธ์

ระดับตำบล

- ครัวเรือนที่ได้รับการซ่อมแซม/ปรับปรุง/สร้างที่อยู่อาศัย 15,000 ครัวเรือน (ภาคละ 3,000 ครัวเรือน)
- หน่วยงาน/ภาคธุรกิจเอกชน/ภาคประชาสังคมที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ/ทรัพยากรในการพัฒนาที่อยู่อาศัย
- รายงานผลการสหภาพการดำเนินงานบ้านพอเพียงชนบทระดับตำบล

ระดับจังหวัด

- ข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย
- แผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย 25 จังหวัด (ภาคละ 5 จังหวัด)

ระดับภาค

- รายงานสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาที่อยู่อาศัย และชุดความรู้ประสบการณ์ความสำเร็จระดับภาค อย่างน้อยภาคละ 2 จังหวัดและ 10 ตำบล

กรอบงบประมาณ



ภาคเหนือ	60,750,000 บาท
ภาคอีสาน	61,250,000 บาท
ภาคกลาง-ตก	60,850,000 บาท
ภาคทท.	60,250,000 บาท
ภาคใต้	60,650,000 บาท

รวมงบประมาณสนับสนุนระดับพื้นที่ทั้งสิ้น 303.75 ล้านบาท

*ขนาดกระดาษ: มีขนาดหน้ากระดาษต้นฉบับประมาณ 11.875 ซม. ใช้จากศูนย์บริการวิชาการในโครงการ

รายงานสรุปผลการอนุมัติ กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ ปี 2561 (เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์)

โครงการบ้านพอเพียงชนบท ได้รับการพิจารณาโครงการแล้วทั้งสิ้น 1,277 โครงการ 73 จังหวัด 1,150 ตำบล 15,421 ครัวเรือน วงเงินอนุมัติจำนวน 276,269,294 บาท จำแนกรายภาคดังนี้

ภาค	เป้าหมาย	กรอบงบ	ผลการอนุมัติตามมติคณะทำงานพิจารณาโครงการภาค					ผลการบันทึกในระบบโปรแกรมบีมอส				
			โครงการ	จังหวัด	ตำบล	ครัวเรือน	จำนวนเงิน	โครงการ	จังหวัด	ตำบล	ครัวเรือน	จำนวนเงิน
ภาคเหนือ	3,000	60,750,000	458	15	430	3,270	57,000,000	458	15	419	3,306	58,750,000
ภาคอีสาน	3,000	61,250,000	261	18	261	2,746	51,875,673	257	18	240	2,726	50,012,132
ภาคใต้	3,000	60,650,000	66	14	50	3,174	60,650,000	148	14	142	3,178	59,479,969
ภาคทท./ออก	3,000	60,250,000	145	11	99	2,788	49,802,166.00	145	11	99	2,788	49,802,166
ภาคกลาง/ตก	3,000	60,850,000	347	15	310	3,443	56,941,455	347	16	331	3,287	60,597,979
รวม	15,000	303,750,000	1,277	73	1,150	15,421	276,269,294	1,355	74	1,231	15,285	278,642,246

รายงานผลการบันทึกในระบบโปรแกรม บีมอส ณ 28 กุมภาพันธ์ 2561 พบว่าสำนักงานภาคอยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมบีมอส ซึ่งกองเลขาจะดำเนินการตรวจสอบผลการบันทึกกับรายงานการประชุมต่อไป

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2560 (กลุ่มโครงการเดิม)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มโครงการเดิม มียอดคงเหลือยกมา 3,681,096 บาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้กับองค์กรชุมชนได้จำนวนรวมทั้งสิ้น 3,477,096 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.46 เมื่อเทียบกับยอดคงเหลือยกมา และมีงบประมาณคงเหลือไม่ประสงค์จะเบิกจ่ายและขอปิดโครงการจำนวน 204,000 บาท

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 (กลุ่มโครงการปี 2561)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มโครงการปี 2561 ผลการอนุมัติจากระบบโปรแกรมบีมอส จำนวน 278,642,246 บาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้กับองค์กรชุมชนได้จำนวนรวมทั้งสิ้น 133,567,381 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.94 เมื่อเทียบกับผลการอนุมัติ และมีงบประมาณคงเหลือรอเบิกจ่ายจำนวน 145,074,865 บาท จำแนกรายภาคดังนี้

สำนักงานภาค	จำนวนโครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย
ภาคกรุงเทพ/ออก	137	49,802,166	26,948,209	22,853,957	54.11
ภาคกลาง/ตะวันตก	347	60,597,979	32,363,866	28,234,113	53.41
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	255	50,012,132	9,388,910	40,623,222	18.77
ภาคใต้	148	59,479,969	36,932,200	22,547,769	62.09
ภาคเหนือ	458	58,750,000	27,934,196	30,815,804	47.55
รวม	1,345	278,642,246	133,567,381	145,074,865	47.94
