

รายงานสถานะโครงการสนับสนุนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน และโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก)
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) มีจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน โดยกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ และงบประมาณในการสนับสนุนพื้นที่ ตั้งแต่ในระดับครัวเรือน ตำบล/เมือง จังหวัด ภาค และระดับชาติ ภายใต้โครงการและกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล และแผนปฏิบัติการประจำปี ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการร่วมกับขบวนองค์กรชุมชนทุกประเด็นงานในการออกแบบและขับเคลื่อนงานพัฒนาเพื่อสร้างพื้นที่รูปธรรม พัฒนาคุณภาพองค์กรชุมชนและแกนนำในพื้นที่ รวมทั้งเชื่อมโยงและบูรณาการความร่วมมือระหว่างชุมชน หน่วยงานและภาคีพัฒนาในพื้นที่

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีโครงการพัฒนาต่างๆ สนับสนุนการพัฒนาทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น ได้แก่

1. โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปี 2560 - 2561
2. โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปี 2560 - 2561
3. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก ปี 2560 - 2561

ผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาทั้ง 3 โครงการของสถาบันฯ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) มีรายละเอียดดังนี้


(หน่วย:ล้านบาท)

โครงการ	กรอบงบประมาณ	การอนุมัติ			การเบิกจ่ายงบประมาณ				งบประมาณที่ยังไม่อนุมัติ
		จำนวนโครงการ	จำนวนตำบล/กองทุน	งบอนุมัติ	การเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่ายจากงบอนุมัติ	ร้อยละการเบิกจ่ายจากกรอบงบ	
1. โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน	207.86	325	10,299*	203.66	170.74	32.92	83.84	82.14	4.20
1.1 โครงการเสริมสร้างฯ 2560	110.66	115	5,026	108.68	108.35	0.33	99.70	97.91	1.98
1.2 โครงการเสริมสร้างฯ 2561	97.20	210	5,273	94.98	62.39	32.59	65.69	64.19	2.22
2. โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน	342.74	1,450	1,333	302.37	222.05	80.32	73.44	64.79	40.37
2.1 โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน 2560	169.59	671	624	167.53	167.21	0.32	99.81	98.59	2.06
2.2 โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน 2561	173.15	779	709	134.84	54.84	80.00	40.67	31.67	38.31
3. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก	75.00	522	1,051	74.06	54.29	19.77	73.31	72.39	0.94
3.1 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก 2560	37.50	256	513	37.50	32.77	4.73	87.39	87.39	-
3.2 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก 2561	37.50	266	538	36.56	21.52	15.04	58.86	57.39	0.94
รวม	625.60	2,297	12,683	580.09	447.08	133.01	77.07	71.46	45.51

*หมายเหตุ : จำนวนตำบลในโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน มีการนับซ้ำในบางตำบลที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณทั้งปี 2560 และปี 2561

การอนุมัติและการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ณ วันที่ 2 เมษายน 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

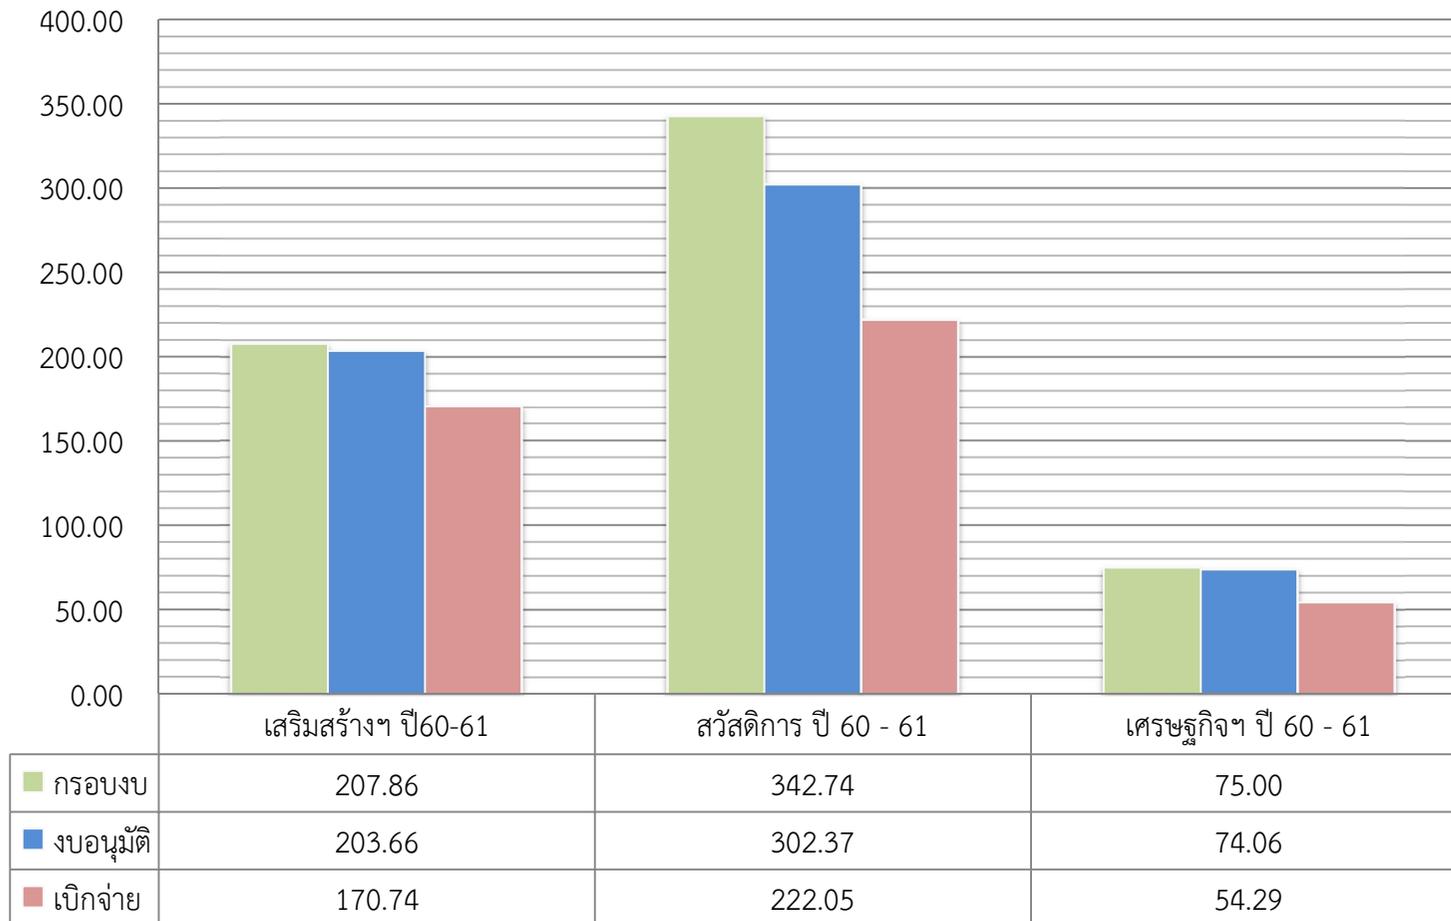

1. โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน

1.1 ภาพรวมความคืบหน้าสถานะโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ประกอบด้วย โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถปี 2560 และ ปีงบประมาณ 2561 วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวน 207.86 ล้านบาท มีการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) ดังนี้

○ จำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติแก่ชุมชน/เครือข่าย/ภาคี จำนวน 325 โครงการ 203.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.98 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และคงเหลืองบประมาณที่ยังไม่มีการอนุมัติจำนวน 4.20 ล้านบาท โดยโครงการในปี 2561 ที่ยังไม่อนุมัติเป็นโครงการของสำนักงานภาคกรุงเทพ ปริมณฑลและตะวันออก สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และส่วนกลาง

○ จำนวนงบประมาณที่ได้มีการเบิกจ่ายจากงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติ มีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการแล้วจำนวน 170.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.84 ของงบอนุมัติ คงเหลืองบประมาณ จำนวน 32.92 ล้านบาทที่ยังไม่เบิกจ่าย ทั้งนี้ โครงการในปี 2561 งบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายส่วนใหญ่เป็นงบประมาณของสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

○ โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถปี 2560 สำนักงานภาคและส่วนกลาง ส่งบันทึกขออนุมัติปิดโครงการ ให้สำนักนโยบายและแผนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสำนักนโยบายและแผนจะดำเนินการปิดโครงการภาพรวมต่อไป

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ	จน.งบที่ได้รับ อุดหนุน	การอนุมัติและเบิกจ่าย					งบคงเหลือ ที่ยังไม่อนุมัติ
		จน.โครงการ	จำนวนตำบล	งบอนุมัติ	งบเบิกจ่าย	งบอนุมัติแล้วและยังไม่ เบิกจ่าย	
2560	110,660,000	115	5,026	108,683,015	108,352,640	330,375	1,977,085
2561	97,200,000	210	5,273	94,980,000	62,393,269	32,586,731	2,220,000
รวม	207,860,000	325	10,299**	203,663,015	170,745,909	32,917,106	4,197,085

หมายเหตุ : *ผลการดำเนินงานรวม 10,299 ตำบล มีการนับซ้ำในบางตำบลที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ทั้งปี 2560 และปี 2561

1.2 สถานะโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปีงบประมาณ 2561

○ การอนุมัติโครงการและงบประมาณ จากกรอบงบประมาณโครงการเสริมสร้างฯ ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งได้มีการจัดสรรและกระจายกรอบงบประมาณ สนับสนุนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนระดับภาค 5 ภาค และส่วนกลาง โดยมีกรอบงบประมาณรวมจำนวน 97.20 ล้านบาท มีการอนุมัติโครงการและงบประมาณแล้ว จำนวน 210 โครงการ เป็นเงิน 94.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.72 ของกรอบงบประมาณ และมีงบประมาณคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติจำนวน 2.22 ล้านบาท จากโครงการ ที่ได้มีการอนุมัติจำนวน 210 โครงการ พบว่ามีการบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม ProMaps จำนวน 183 โครงการ ตามกรอบการทำงานในปี 2561 กำหนดให้อนุมัติโครงการและงบประมาณครบ 100% ภายในไตรมาส 2 (ม.ค. – มี.ค.2561) ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานภาคที่ยังอนุมัติโครงการและงบประมาณไม่แล้วเสร็จ เร่งรัดการอนุมัติโครงการและงบประมาณ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลในระบบให้เรียบร้อย ภายในเดือนเมษายน 2561


ที่	ภาค	กรอบงบ	การอนุมัติ			งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ	ข้อมูลบันทึกใน Promaps		ข้อมูลที่ยังไม่บันทึก	
			จน.โครงการ	จำนวนตำบล	งบอนุมัติ		จน.โครงการอนุมัติ	งบอนุมัติ	โครงการ	งบอนุมัติ
1	เหนือ	16,180,000.00	15	374	16,180,000.00	-	15	16,180,000.00	-	-
2	อีสาน	28,330,000.00	126	1,710	28,300,000.00	30,000.00	99	23,996,800.00	27	4,303,200.00
3	ใต้	14,260,000.00	18	1,130	14,260,000.00	-	18	14,260,000.00	-	-
4	กลางและตะวันตก	16,955,000.00	27	1,288	16,955,000.00	-	27	16,955,000.00	-	-
5	กทม.ปริมณฑลตะวันออก	10,255,000.00	23	771	9,565,000.00	690,000.00	23	9,565,000.00	-	-
6	ส่วนกลาง	11,220,000.00	1	374	9,720,000.00	1,500,000.00	1	9,720,000.00	-	-
	สนับสนุนการประชุมและกลไกการดำเนินงานสภาฯ ระดับชาติ	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	งบบริหารจัดการ	9,720,000.00	1	-	9,720,000.00	-	1	9,720,000.00	-	-
	รวม	97,200,000.00	210	5,273	94,980,000.00	2,220,000.00	183	90,676,800.00	27	4,303,200.00

○ การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเสริมสร้างฯ ปีงบประมาณ 2561 จากโครงการและงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติจำนวน 210 โครงการ 94.98 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 62.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.69 ของงบอนุมัติ และร้อยละ 64.19 ของกรอบงบประมาณ และมีงบประมาณคงเหลือจำนวน 32.59 ล้านบาท ที่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย


ทั้งนี้ เงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ภายใน 4 เดือน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติโครงการ ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการเบิกจ่ายงบประมาณน้อยสุด ร้อยละ 56.36 (มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 60 โครงการ จาก 126 โครงการ) จึงขอให้สำนักงานภาคเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

ภาค	กรอบงบ	จน.โครงการอนุมัติ	จำนวนตำบล	งบอนุมัติ (บาท)	งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ	งบเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ งบเบิกจ่าย จากงบอนุมัติ	ร้อยละ งบเบิกจ่าย จากกรอบ งบ	งบคงเหลือ (บาท)	จน.โครงการที่ยังไม่เบิกจ่ายงวดที่ 1
เหนือ	16,180,000.00	15	374	16,180,000.00	-	11,326,000.00	70.00	70.00	4,854,000.00	-
อีสาน	28,330,000.00	126	1,710	28,300,000.00	30,000.00	15,950,120.00	56.36	56.30	12,349,880.00	จำนวน 66 โครงการ
ใต้	14,260,000.00	18	1,130	14,260,000.00	-	9,283,149.00	65.10	65.10	4,976,851.00	จำนวน 2 โครงการ
กลางและ ตะวันตก	16,955,000.00	27	1,288	16,955,000.00	-	10,500,000.00	61.93	61.93	6,455,000.00	จำนวน 12 โครงการ
กทม.ปริมณฑล ตะวันออก	10,255,000.00	23	771	9,565,000.00	690,000.00	5,614,000.00	58.69	54.74	3,951,000.00	จำนวน 5 โครงการ
ส่วนกลาง	11,220,000.00	1	374	9,720,000.00	1,500,000.00	9,720,000.00	100.00	86.63	-	-
รวม	97,200,000.00	210	5,273	94,980,000.00	2,220,000.00	62,393,269.00	65.69	64.19	32,586,731.00	จำนวน 85 โครงการ

แผนภูมิเปรียบเทียบกรอบงบประมาณ การอนุมัติ และการเบิกจ่าย
งบประมาณโครงการเสริมสร้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

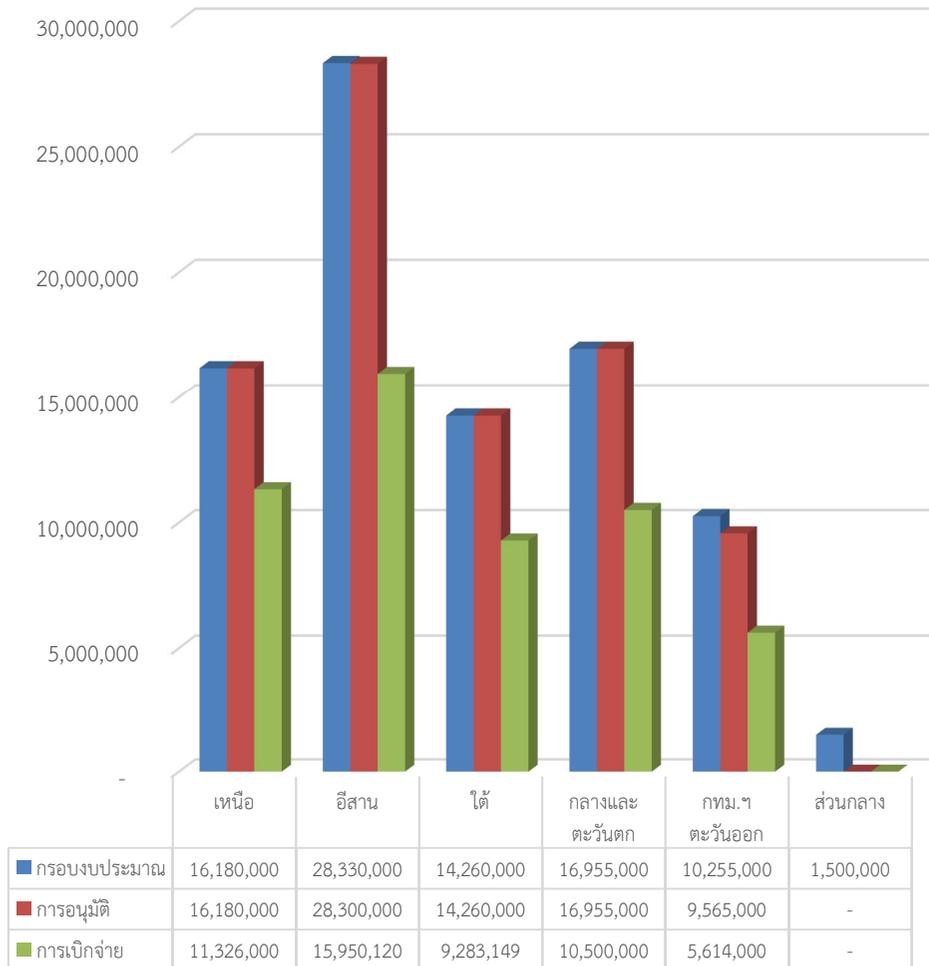

แผนภูมิเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณ
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม 2561 (ยอดเบิกจ่ายสะสม)

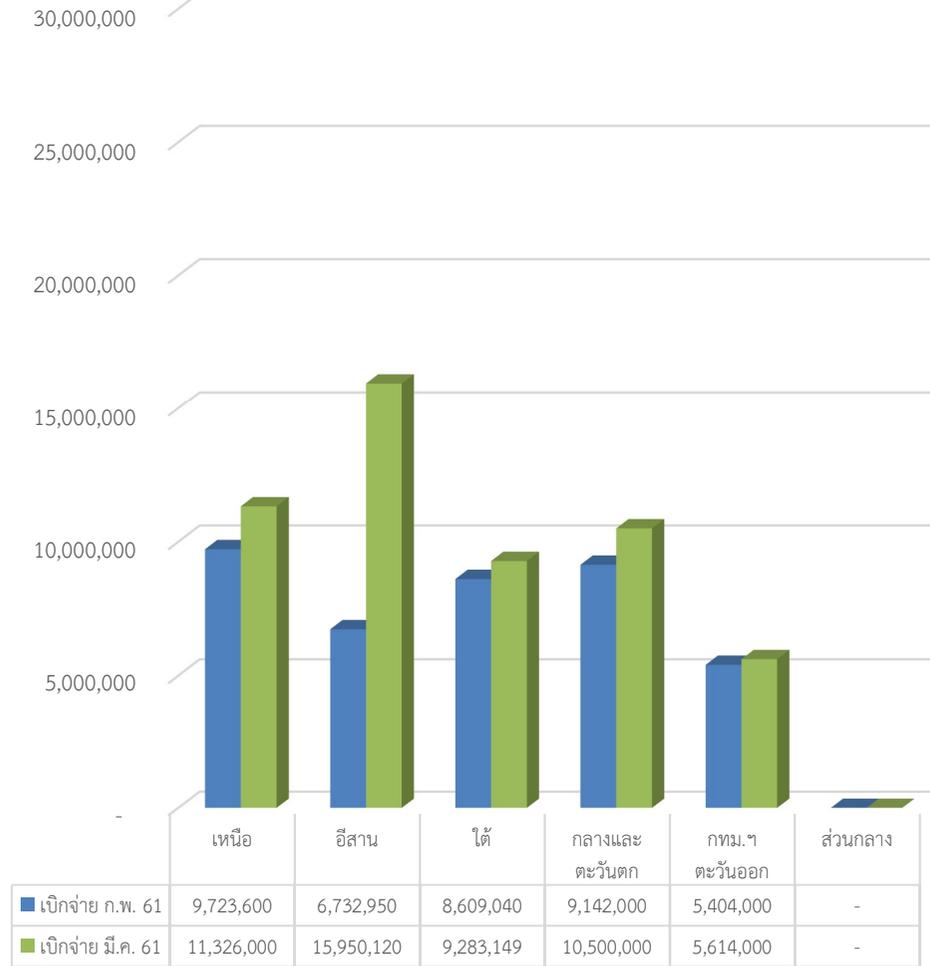

○ การบันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูลโปรแกรม ProMaps

จากการตรวจทานข้อมูลโครงการเสริมสร้างฯ ปีงบประมาณ 2561 ในภาพรวมได้มีการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลโครงการ องค์กร และการแนบไฟล์เอกสาร จากจำนวนโครงการทั้งหมด 209 โครงการ ของ 5 ภาค และส่วนกลาง พบว่ามีการบันทึกข้อมูลจำนวน 182 โครงการ และข้อมูลมีความครบถ้วนเฉลี่ยร้อยละ 63.56 ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานภาคตรวจสอบความถูกต้อง และขอให้แนบเอกสาร รายละเอียดตามที่กำหนด ซึ่งข้อมูลที่ได้มีการบันทึกในระบบจะนำไปสู่การตรวจสอบของหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร และการประมวลผลข้อมูลภาพรวมโครงการ

ภาค	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการที่บันทึก	สถานะข้อมูลที่มีการบันทึก									เอกสารแนบ				
			มติ กก. ภาค/ จว.	ข้อมูลเบื้องต้นโครงการ	ข้อมูลองค์กรผู้เสนอ	กิจกรรมโครงการ	บันทึกความร่วมมือ	จำนวนตำบล (ระบุจน.)	ข้อมูลโครงการย่อยระดับตำบล	บัญชีผู้รับเงิน	แผนการเบิกจ่าย	เอกสารโครงการ	MOU	แบบแสดงผลอนุมัติ	สำเนาบัญชี	แผนการใช้จ่ายเงิน
ภาคเหนือ	15	15	15	15	15	15	15	374	0	15	15	13	14	14	14	14
ภาคอีสาน	126	99	99	99	76	99	84	1,710	0	82	78	39	34	35	26	35
ภาคใต้	18	18	18	18	18	18	18	1,130	0	18	17	16	16	16	16	16
กลาง ตะวันตก	27	27	27	27	16	27	17	1,288	141	27	27	1	11	11	11	12
กทม. ตะวันออก	23	23	23	23	23	23	14	771	242	21	19	13	14	14	14	14
ส่วนกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	209	182	182	182	148	182	148	5,273	383	163	156	82	89	90	81	91
คิดเป็นร้อยละ			87.08	87.08	70.81	87.08	70.81			77.99	74.64	39.23	42.58	43.06	38.76	43.54


1.3 ระยะเวลาในกระบวนการบริหารโครงการ จากการบริหารโครงการที่ผ่านมา และได้มีการทบทวนและพัฒนากระบวนการบริหารโครงการในทุกขั้นตอน เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นการประกันคุณภาพการดำเนินงานขององค์กรในการสนับสนุนองค์กรชุมชนและภาคีพัฒนาที่ได้รับการสนับสนุนโครงการและงบประมาณจากสถาบันฯ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้กำหนดมาตรฐานระยะเวลาในการบริหารโครงการนับตั้งแต่ได้รับความเห็นชอบจากกลไกพิจารณา กลั่นกรอง จนกระทั่งเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานไม่เกิน 55 วัน โดยแยกเป็น 1) กระบวนการพิจารณาโครงการ : ระยะเวลาในการบริหารโครงการตั้งแต่คณะทำงานพิจารณาโครงการระดับภาคพิจารณาเห็นชอบโครงการจนถึง ผอ.ภาคลงนามอนุมัติ จำนวน 30 วัน และ 2) กระบวนการเบิกจ่ายโครงการ : ระยะเวลาหลังจาก ผอ.ภาคลงนามอนุมัติ จนถึงการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก จำนวน 25 วัน

การบริหารโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 209 โครงการ พบว่า

- โครงการที่ใช้ระยะเวลาตามเกณฑ์ จำนวน 50 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.92 ของโครงการทั้งหมด ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 42 วัน
 - โครงการที่ใช้ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ จำนวน 74 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35.41 โครงการทั้งหมด ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 69 วัน
 - โครงการที่ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก จำนวน 85 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40.67 ของโครงการทั้งหมด โดยมีระยะเวลายังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกนานสุด 107 วัน
- จึงขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งรัดการเบิกจ่าย เพื่อให้ดำเนินการได้ตามมาตรฐาน พร้อมทั้งตรวจสอบปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้า เพื่อนำมาวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาและการออกแบบการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพในอนาคต

ข้อสังเกต : โครงการที่สามารถใช้ระยะเวลาตามเกณฑ์ 55 วัน จำนวน 50 โครงการ มีระยะเวลาในแต่ละกระบวนการ ดังนี้

- 1) กระบวนการพิจารณาโครงการ ระยะเวลาในการบริหารโครงการตั้งแต่คณะทำงานพิจารณาโครงการระดับภาคพิจารณาเห็นชอบโครงการจนถึง ผอ.ภาคลงนามอนุมัติ จำนวน 30 วัน : สามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐาน ใช้เวลานานสุด 19 วัน
- 2) กระบวนการเบิกจ่ายโครงการ : ระยะเวลาหลังจาก ผอ.ภาคลงนามอนุมัติ จนถึงการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก จำนวน 25 วัน : โดยส่วนมากใช้ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ใช้เวลานานสุด 45 วัน

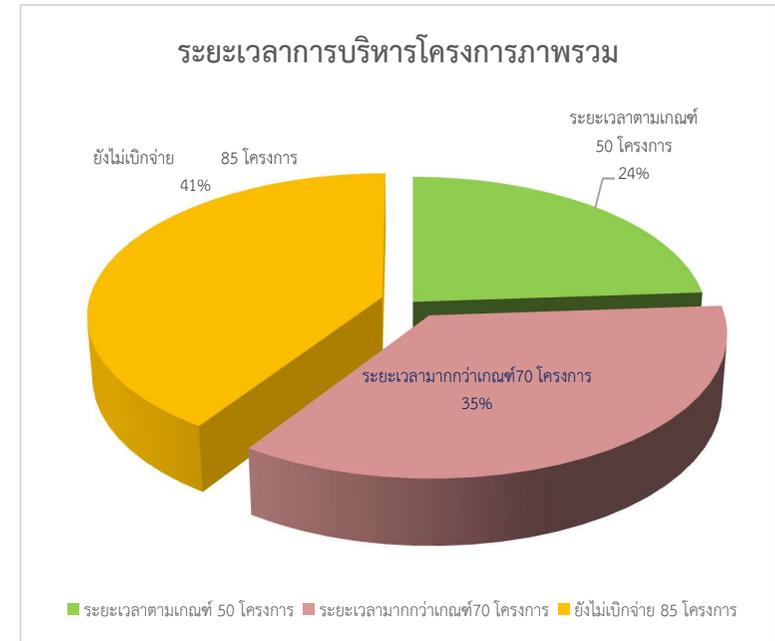

ตาราง แสดงระยะเวลาการบริหารโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปีงบประมาณ 2561

ภาค	การบริหารโครงการ	ร้อยละ	ระยะเวลาตามมาตรฐานการบริหารโครงการ		รวมใช้ระยะเวลา (55 วัน)	จำนวนวันเฉลี่ย
			คณะทำงานพิจารณา - ผอ. อนุมัติ (30 วัน)	ผอ.อนุมัติ-เบิกจ่ายงวด แรก(25 วัน)		
เหนือ 15 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 7 โครงการ	46.67	4 - 7 วัน	16 - 45 วัน	20 - 49 วัน	36 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 8 โครงการ	53.33	4 วัน	64 - 93 วัน	68 - 97 วัน	74 วัน
อีสาน 126 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 10 โครงการ	7.94	15 - 19 วัน	8 - 30 วัน	27 - 45 วัน	39 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 50 โครงการ	39.68	15 วัน	49 - 79 วัน	64 - 93 วัน	78 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 66 โครงการ	52.38	15 - 35 วัน	ระยะเวลาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 46 - 97 วัน		
ใต้ 18 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 12 โครงการ	66.67	4 - 9 วัน	24 - 43 วัน	28 - 52 วัน	48 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 4 โครงการ	22.22	9 วัน	50 - 59 วัน	59 - 68 วัน	65 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 2 โครงการ	11.11	8 - 9 วัน	ระยะเวลาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 41 - 107 วัน		
กลาง และ ตะวันตก 27 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 8 โครงการ	29.63	13 วัน	22 - 40 วัน	35 - 53 วัน	43 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 7 โครงการ	25.93	13 วัน	46 - 61 วัน	59 - 74 วัน	65 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 12 โครงการ	44.44	8 - 13 วัน	ระยะเวลาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 49 -101 วัน		
กทม.ปริมณฑลตะวันออก 23 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 13 โครงการ	56.52	14 - 17 วัน	9 - 36 วัน	25 - 53 วัน	43 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 5 โครงการ	21.74	17 วัน	39 - 51 วัน	56 - 68 วัน	64 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 5 โครงการ	21.74	14 วัน	ระยะเวลาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 53 วัน		
ส่วนกลาง	ระยะเวลาตามเกณฑ์ - โครงการ	-	-	-	-	-
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ - โครงการ	-	-	-	-	-
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย - โครงการ	-	-	-	-	-
รวม 209 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 50 โครงการ	23.92	4 - 19 วัน	8 - 45 วัน	20 - 53 วัน	42 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 74 โครงการ	35.41	4 - 17 วัน	39 - 93 วัน	56 - 97 วัน	69 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 85 โครงการ	40.67	14 - 35 วัน	ระยะเวลาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 41 - 107 วัน		
ระยะเวลาการบริหารโครงการ ปี 2560 จำนวน 115 คก.	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 68 โครงการ	59.13	2 - 27 วัน	3 - 54 วัน	6 - 64 วัน	47 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 47 โครงการ	41.22	3 - 92วัน	10 - 181 วัน	68 - 189 วัน	96 วัน

2. โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน

2.1 ภาพรวมความคืบหน้าโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ประกอบด้วยโครงการ โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปี 2560 และปี 2561 วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวนรวม 342.74 ล้านบาท มีการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) ดังนี้

- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ แก่กองทุนสวัสดิการ/เครือข่าย/ภาคี จำนวน 1,450 โครงการ 302.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.22 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และคงเหลืองบประมาณที่ยังไม่มีการอนุมัติจำนวน 40.37 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นงบประมาณของปี 2561
- จำนวนงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย จากงบประมาณที่มีการอนุมัติ มีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการแล้วจำนวน 222.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.44 ของงบประมาณที่มีการอนุมัติ

ปีงบประมาณ	กรอบงบประมาณ	การอนุมัติ			การเบิกจ่ายงบประมาณ			งบประมาณที่ยังไม่อนุมัติ
		จำนวนโครงการ	จำนวนตำบล/กองทุน	งบอนุมัติ	การเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย	
2560	169.59	671	624	167.53	167.21	0.32	99.81	2.06
2561	173.15	779	709	134.84	54.84	80.00	59.36	38.31
รวม	342.74	1,450	1,333	302.37	222.05	80.32	73.44	40.37

2.2 โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน 2560

โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปี 2560 วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรรวมจำนวน 169.586 ล้านบาท ประกอบด้วยแนวทางการดำเนินงานใน 3 ระดับได้แก่

- การสมทบงบกองทุนสวัสดิการชุมชนรอบแรกและรอบที่สาม จำนวน 500 ตำบล 340,000 คน
- การสนับสนุนการดำเนินงานระดับภาค โดยสนับสนุนกลไกและการเชื่อมโยงขบวนองค์กรชุมชนใน 5 ภาค และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพขบวนองค์กรชุมชนและผู้นำการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับตำบล จังหวัด ภาค รวมทั้งแกนนำงานประเด็นงานต่างๆ จำนวน 3,000 คน
- การสนับสนุนการดำเนินงานในส่วนกลาง โดยสนับสนุนการเชื่อมโยงกลไกและขบวนระดับชาติ/ส่วนกลาง รวมทั้งการติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน

➤ การดำเนินงานโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปี 2560 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) มีสถานะ ดังนี้

- จำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติ ให้แก่ กองทุนสวัสดิการชุมชน/เครือข่าย/ภาคี จำนวน 671 โครงการ เป็นงบประมาณรวม 167.53 ล้านบาท โดยแยกเป็น 1) ค่าบริหารจัดการ จำนวน 16.96 ล้านบาท 2) การสนับสนุนการเชื่อมโยงกลไกและขบวนการ ระดับชาติ จำนวน 1.90 ล้านบาท 3) การสนับสนุนการดำเนินงานระดับภาค จำนวน 25 ล้านบาท และ 4) การสมทบกองทุนสวัสดิการ จำนวน 123.67 ล้านบาท โดยสมทบ 624 กองทุน จำนวนสมาชิกที่ได้รับการสมทบรวม 419,237 ราย เป็นการสมทบในรอบแรก 257 กองทุน สมทบในรอบที่สอง 40 กองทุน และสมทบในรอบที่สาม จำนวน 327 กองทุน การอนุมัติงบประมาณรวมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 98.79 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และคงเหลืองบประมาณที่ไม่ได้รับการอนุมัติจำนวน 2.05 ล้านบาท
- จำนวนงบประมาณที่ได้มีการเบิกจ่าย จากงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติมีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการแล้วจำนวน 167.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.81 ของงบอนุมัติ คงเหลืองบประมาณยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 0.32 ล้านบาท

หน่วย : บาท

โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชนปี 2560	จ.งบที่ได้รับอุดหนุน	การอนุมัติและเบิกจ่าย					งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ	
		จ.โครงการ	จำนวนกองทุน	จำนวนสมาชิกที่ได้รับการสมทบ	งบอนุมัติ	งบเบิกจ่าย		งบอนุมัติที่ยังไม่เบิกจ่าย
	169,586,000	671	624	419,237	167,533,243	167,212,950	320,293	2,052,757


➤ สถานะโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปี 2560 แยกการอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณรายภาค

การอนุมัติงบประมาณโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปี 2560 มีการอนุมัติโครงการรวม 671 โครงการ สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 624 กองทุน จำนวนสมาชิกสมทบ 419,237 ราย วงเงินอนุมัติรวม 167.53 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 167.21 ล้านบาท โดยคงเหลือโครงการที่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการแล้วแต่ยังเบิกจ่ายงบประมาณไม่แล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนกลไกและการเชื่อมโยงองค์กรชุมชนระดับภาคของภาคใต้ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้ประสานกับสำนักงานภาคให้ตรวจสอบการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการดังกล่าว เพื่อทำการปิดโครงการ


ที่	ภาค	กรอบงบ	เสนอ ผอ. อนุมัติ				งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ	การเบิกจ่าย	
			จน.โครงการ	จน.กองทุน	สมาชิกสมทบ	งบอนุมัติ		เบิกจ่าย	คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย
1	ภาคเหนือ**	46,701,326	177	172	133,912	46,652,235	49,091	46,652,235	-
2	ภาคอีสาน	38,124,295	185	182	123,928	38,121,395	2,900	38,121,395	-
3	ภาคใต้**	20,817,536	104	94	63,217	20,738,211	79,325	20,417,918	320,293
4	ภาคกลางตะวันตก	25,520,014	126	122	58,545	25,228,120	291,894	25,228,120	-
5	ภาคกทม.ตะวันออก	17,936,829	78	54	39,635	17,934,682	2,147	17,934,682	-
6	ส่วนกลาง	20,486,000	1	-	-	18,858,600	1,627,400	18,858,600	-
	เชื่อมโยงกลไก/ขบวนระดับชาติ/ส่วนกลาง	3,527,400	1	-	-	1,900,000	1,627,400	1,900,000	-
	งบบริหารจัดการ	16,958,600	-	-	-	16,958,600	-	16,958,600	-
	รวม	169,586,000	671	624	419,237	167,533,243	2,052,757	167,212,950	320,293

**หมายเหตุ 1) สำนักงานภาคเหนือยกเลิกโครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านยาง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 47,085 บาท สมาชิกสมทบ 129 คน ตามบันทึก สก 48/1098 ลงวันที่ 13 มีค 2560
 2) สำนักงานภาคใต้ยกเลิกโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลควนโดน จังหวัดสตูล จำนวน 79,200 บาท สมาชิกสมทบ 220 คน ตามบันทึก สก 54/4153 ลงวันที่ 25 ธค 2560

แผนภูมิเปรียบเทียบกรอบงบฯ การอนุมัติและการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปีงบประมาณ 2560

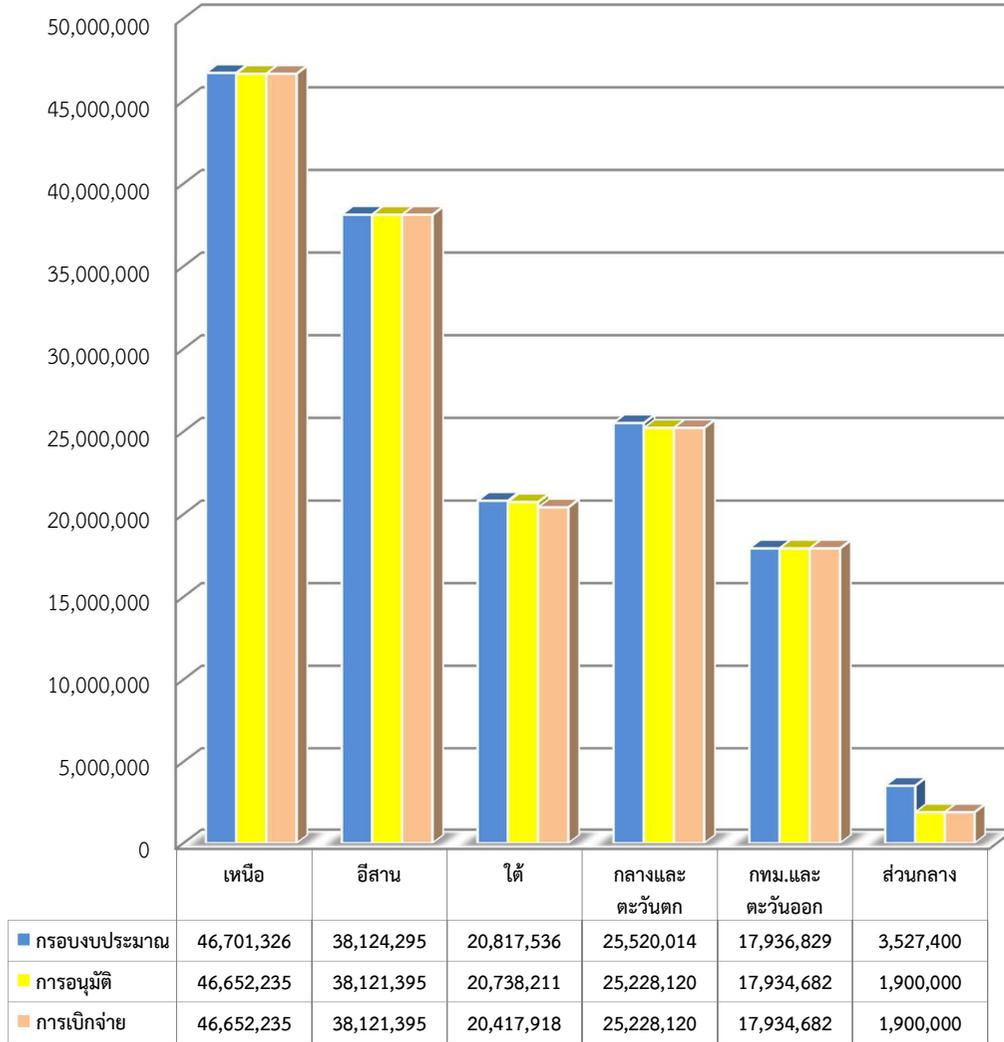

แผนภูมิเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสนับสนุนสวัสดิการ
ชุมชน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และเดือนมีนาคม 2561

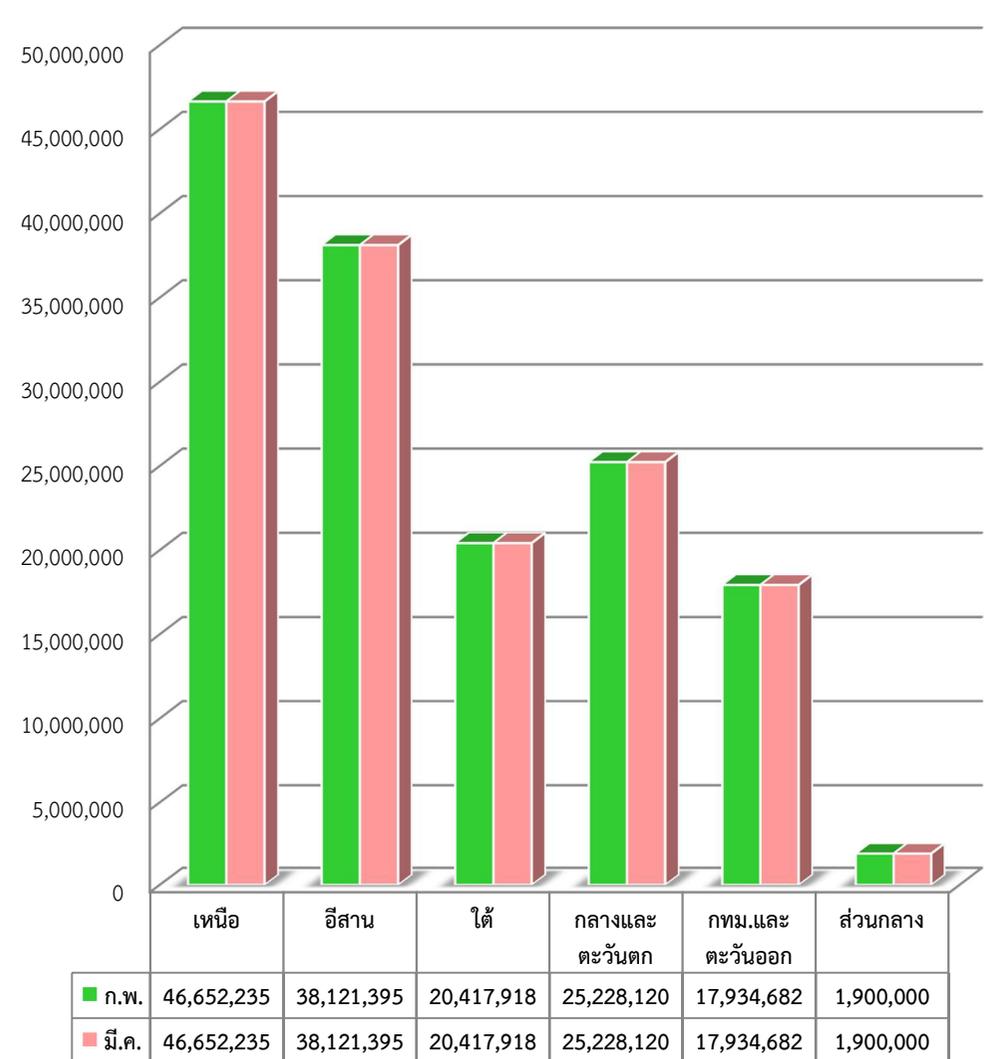

หมายเหตุ : ไม่รวมงบบริหารจัดการ

➤ การบันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูลโปรแกรม ProMaps

จากการตรวจทานข้อมูลโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปีงบประมาณ 2560 การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล จากจำนวนโครงการทั้งหมด 671 โครงการ พบว่า มีการบันทึกข้อมูลในระบบครบทุกโครงการแล้ว และมีความครบถ้วนของการบันทึกข้อมูลเฉลี่ยร้อยละ 99.83 ทั้งนี้ มีโครงการที่ดำเนินการโดยสำนักงานภาคใต้จำนวน 2 โครงการ ยังไม่มีการแนบเอกสารโครงการและแบบแสดงผลอนุมัติในระบบ และเป็นการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบโปรแกรมบริหารการเงิน พอช. (CODI E - FINANCE) ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายโดยสำนักงานภาคใต้ จึงไม่มีการบันทึกความร่วมมือ (MOU)

ภาค	จน.โครงการที่อนุมัติ	จน.โครงการที่บันทึก	สถานะข้อมูลที่มีการบันทึก									เอกสารแนบ				
			มติ กก.ภาค/จว.	ข้อมูลโครงการ	ข้อมูลองค์กร	กิจกรรมโครงการ	MOU	จำนวนผู้รับผลประโยชน์ (คน)	ข้อมูลโครงการย่อย	บัญชีผู้รับเงิน	แผนการเบิกจ่าย	เอกสารโครงการ	MOU	แบบแสดงผลอนุมัติ	สำเนาบัญชี	แผนการใช้จ่ายเงิน
1.เหนือ	177	177	177	177	177	177	177	188,185	0	177	177	177	177	177	177	177
2.อีสาน	185	185	185	185	185	185	185	146,089	0	185	185	185	185	185	185	185
3.ใต้	104	104	104	104	104	104	102	133,192	0	102	104	102	102	102	102	102
4.กลางตะวันตก	126	126	126	126	126	126	126	93,527	0	126	126	126	126	126	126	126
5.กทม.ตะวันออก	78	78	78	78	78	78	78	39,665	0	78	78	78	78	78	78	78
6.ส่วนกลาง	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1
รวม	671	671	671	671	671	671	669			669	671	669	669	669	669	669
(คิดเป็นร้อยละ)		100	100	100	100	100	99.70			99.70	100	99.70	99.70	99.70	99.70	99.70

2.3 โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน 2561

โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปี 2561 วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรรวมจำนวน 173.15 ล้านบาท ประกอบด้วยแนวทางการดำเนินงานใน 3 ระดับ ได้แก่

- การสมทบงบกองทุนสวัสดิการชุมชนรอบแรกและรอบที่สาม จำนวน 500 ตำบล 350,000 คน
- การพัฒนาและสอบทานกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 5,930 กองทุน
- การสนับสนุนเครือข่ายจังหวัดและการประชุมคณะกรรมการจังหวัด จำนวน 77 จังหวัด
- การสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนงานและการเชื่อมโยงระดับภาค/พัฒนาแกนนำ ติดตามและสรุปบทเรียนใน 5 ภาค
- การสนับสนุนการดำเนินงานในส่วนกลาง โดยสนับสนุนการเชื่อมโยงกลไกและขบวนระดับชาติ/ส่วนกลาง สนับสนุนการประชุมระดับชาติ

➤ การดำเนินงานโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปี 2561 ณ เดือนมีนาคม 2561 มีสถานะ ดังนี้

- จำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติ ให้แก่ กองทุนสวัสดิการชุมชน/เครือข่าย/ภาคี จำนวน 779 โครงการ เป็นงบประมาณรวม 134.84 ล้านบาท โดยแยกเป็น 1) ค่าบริหารจัดการ จำนวน 17.32 ล้านบาท 2) การสนับสนุนการดำเนินงานระดับภาค จำนวน 10.30 ล้านบาท 3) การสนับสนุนการดำเนินงานระดับจังหวัด จำนวน 14.83 ล้านบาท และ 4) การสมทบกองทุนสวัสดิการ จำนวน 92.39 ล้านบาท โดยสมทบ 709 กองทุน จำนวนสมาชิกที่ได้รับการสมทบรวม 600,014 ราย เป็นการสมทบในรอบแรก 283 กองทุน สมทบในรอบที่สอง 308 กองทุน และสมทบในรอบที่สาม จำนวน 118 กองทุน การอนุมัติงบประมาณรวมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 77.87 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและคงเหลืองบประมาณที่ไม่ได้รับการอนุมัติจำนวน 38.31 ล้านบาท
- จำนวนงบประมาณที่ได้มีการเบิกจ่าย จากงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติมีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการแล้วจำนวน 54.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.67 ของงบอนุมัติ คงเหลืองบประมาณยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 80.00 ล้านบาท

หน่วย : บาท

โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปี 2561	จ.งบที่ได้รับอุดหนุน	การอนุมัติและเบิกจ่าย						งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ
		จ.โครงการ	จำนวนกองทุน	จำนวนสมาชิกที่ได้รับการสมทบ	งบอนุมัติ	งบเบิกจ่าย	งบอนุมัติที่ยังไม่เบิกจ่าย	
	173,150,000	779	709	600,014	134,843,355	54,843,238	80,000,117	38,306,645


➤ สถานะโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปี 2561 แยกการอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณรายภาค

การอนุมัติงบประมาณโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปี 2561 มีการอนุมัติโครงการรวม 779 โครงการ สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 709 กองทุน จำนวนสมาชิกสมทบ 600,014 ราย วงเงินอนุมัติรวม 134.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.87 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และมีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 54.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.67 ของงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติ คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่ายจำนวน 80.00 ล้านบาท


ที่	ภาค	กรอบงบ	เสนอ ผอ. อนุมัติ				งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ	การเบิกจ่าย		ข้อมูลบันทึกใน Promaps	
			จ.โครงการ	จ.กองทุน	สมาชิกสมทบ	งบอนุมัติ		เบิกจ่าย	คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย	จ.โครงการ	งบอนุมัติ
1	ภาคเหนือ	37,613,117	215	211	197,288	37,613,051	66	27,994,139	9,618,912	215	37,613,051
2	ภาคอีสาน	62,509,658	142	121	129,629	28,548,651	33,961,007	2,930,900	25,617,751	69	14,725,169
3	ภาคใต้	16,192,593	186	171	159,367	16,191,718	875	2,668,285	13,523,433	186	16,191,718
4	ภาคกลางตะวันตก	25,037,760	181	163	90,604	25,033,778	3,982	1,575,000	23,458,778	181	25,033,778
5	ภาคกทม.ตะวันออก	12,693,164	55	43	23,126	10,141,157	2,552,007	2,359,914	7,781,243	47	8,793,173

6	ส่วนกลาง	19,103,708	0	0	-	17,315,000	1,788,708	17,315,000	-	1	17,315,000
	เชื่อมโยงกลไก/ชวชน ระดับชาติ/ส่วนกลาง	1,788,708	0	0	-	-	1,788,708	-	-		
	งบบริหารจัดการ	17,315,000	0	0	-	17,315,000	-	17,315,000	-	1	17,315,000
	รวม	173,150,000	779	709	600,014	134,843,355	38,306,645	54,843,238	80,000,117	699	119,671,862

แผนภูมิเปรียบเทียบกรอบงบฯ การอนุมัติและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ
สนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปีงบประมาณ 2561 รายภาค

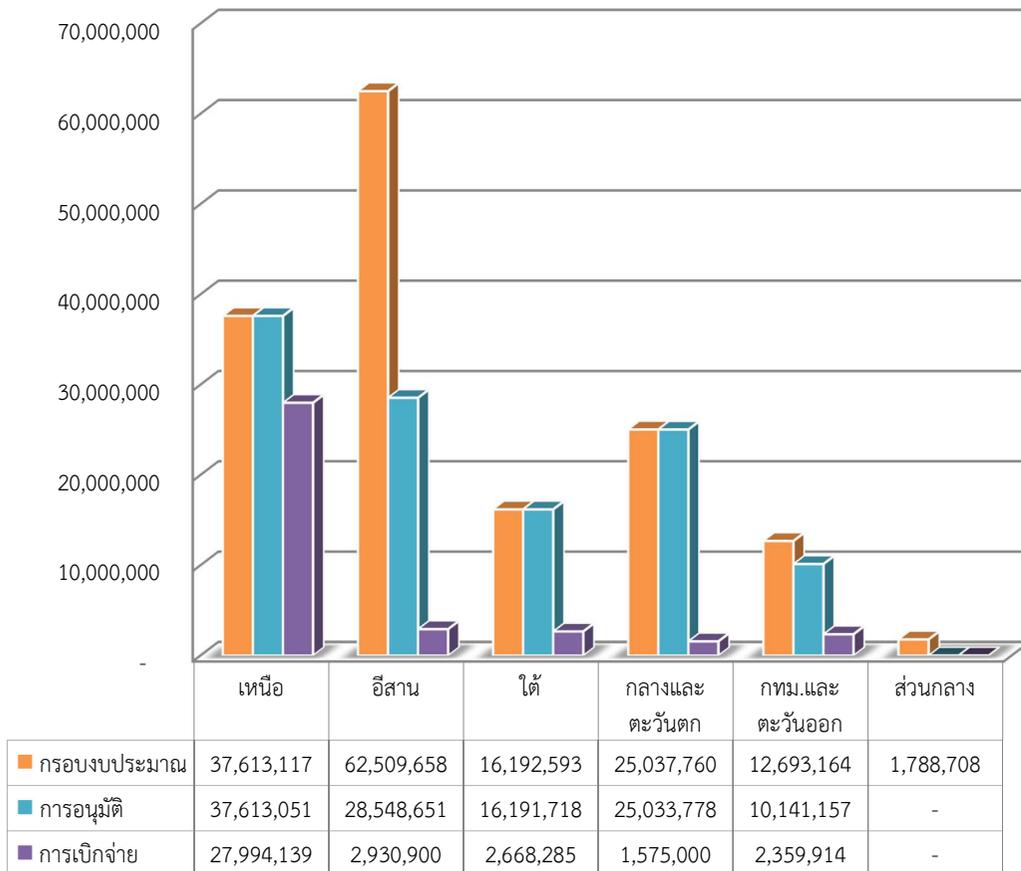

แผนภูมิเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสนับสนุนสวัสดิการ
ชุมชน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม 2561

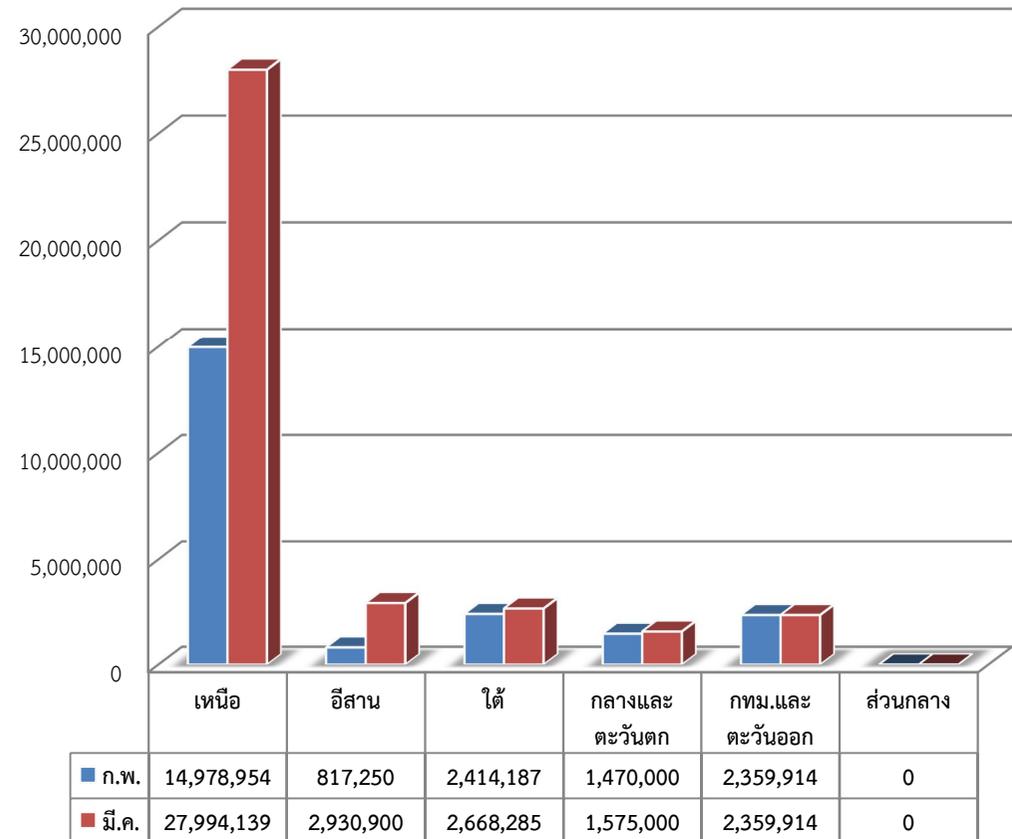

➤ การบันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูลโปรแกรม ProMaps

จากการตรวจทานข้อมูลโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปีงบประมาณ 2561 จากจำนวนโครงการทั้งหมด 779 โครงการ มีการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล จำนวน 698 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 89.60 ของโครงการทั้งหมด และมีความครบถ้วนของการบันทึกข้อมูลเฉลี่ยร้อยละ 53.25 โดยสำนักงานภาคควรตรวจทานการบันทึกข้อมูลและการแนบไฟล์เอกสารในระบบให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องและเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลอย่างละเอียด เนื่องจากข้อมูลที่ได้มีการบันทึกในระบบจะนำไปสู่การตรวจสอบของหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของสถาบันฯ และสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินโครงการต่อไป

ภาค	จน.โครงการที่อนุมัติ	จน.โครงการที่บันทึก	สถานะข้อมูลที่มีการบันทึก										เอกสารแนบ				
			มติ กก.ภาค/จว.	ข้อมูลโครงการ	ข้อมูลองค์กร	กิจกรรมโครงการ	MOU	จำนวนผู้รับผลประโยชน์ (ตำบล)	จำนวนผู้รับผลประโยชน์ (คน)	ข้อมูลโครงการย่อย	บัญชีผู้รับเงิน	แผนการเบิกจ่าย	เอกสารโครงการ	MOU	แบบแสดงผลอนุมัติ	สำเนาบัญชี	แผนการใช้จ่ายเงิน
1.เหนือ	215	215	186	186	158	186	176	0	244,084	0	176	175	157	62	186	62	62
2.อีสาน	142	69	12	12	12	12	12	380	0	0	12	12	3	3	3	3	3
3.ใต้	186	186	186	185	176	186	40	1126	243,142	0	40	41	18	20	20	20	20
4.กลางตะวันตก	181	181	181	180	172	181	181	1082	90,615	0	181	181	0	11	11	11	11
5.กทม.ตะวันออก	55	47	43	43	43	43	43	1296	18,874	0	33	33	11	11	11	11	11
6.ส่วนกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	779	698	608	606	561	608	452	3,884	596,715	0	442	442	189	107	231	107	107
(คิดเป็นร้อยละ)		89.60	87.11	86.82	80.37	87.11	64.76				63.32	63.32	27.08	15.33	33.09	15.33	15.33

➤ **ระยะเวลาในกระบวนการบริหารโครงการ** ตามมาตรฐานการบริหารโครงการ กำหนดระยะเวลาการบริหารโครงการตั้งแต่โครงการรับการพิจารณาอนุมัติจากคณะทำงานพิจารณาโครงการระดับภาค จนกระทั่งเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกให้กับองค์กรที่ได้รับการอนุมัติ รวม 55 วัน โดยแยกเป็น 1) กระบวนการพิจารณาโครงการ ตั้งแต่คณะทำงานพิจารณาโครงการระดับภาคพิจารณาเห็นชอบโครงการจนถึง ผอ. ภาคลงนามอนุมัติ จำนวน 30 วัน และ 2) กระบวนการเบิกจ่ายโครงการหลังจาก ผอ. ภาคลงนามอนุมัติ จนถึงการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก จำนวน 25 วัน


การบริหารโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปี 2561 จำนวน 779 โครงการพบว่า

- มีโครงการที่สามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 185 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.75 ของโครงการทั้งหมด ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 26 วัน
- มีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.34 ของโครงการทั้งหมด โดยใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 72 วัน
- มีโครงการที่ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก จำนวน 568 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคกลางและตะวันตก และภาคกรุงเทพฯ และตะวันออก คิดเป็นร้อยละ 72.91 ของโครงการทั้งหมด โดยมีระยะเวลาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกนานสุด 104 วัน

จึงขอให้ภาคดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมทั้งตรวจสอบปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้า เพื่อนำมาวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาและการออกแบบการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพในอนาคต

ข้อสังเกต : โครงการที่สามารถใช้ระยะเวลาตามเกณฑ์ 55 วัน จำนวน 185 โครงการ มีระยะเวลาในแต่ละกระบวนการ ดังนี้

- 1) กระบวนการพิจารณาโครงการ ระยะเวลาในการบริหารโครงการตั้งแต่คณะทำงานพิจารณาโครงการระดับภาคพิจารณาเห็นชอบโครงการจนถึง ผอ.ภาคลงนามอนุมัติ จำนวน 30 วัน : สามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐาน ใช้เวลานานสุด 17 วัน
- 2) กระบวนการเบิกจ่ายโครงการ : ระยะเวลาหลังจาก ผอ.ภาคลงนามอนุมัติ จนถึงการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก จำนวน 25 วัน : โดยส่วนมากใช้ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ใช้เวลานานสุด 45 วัน

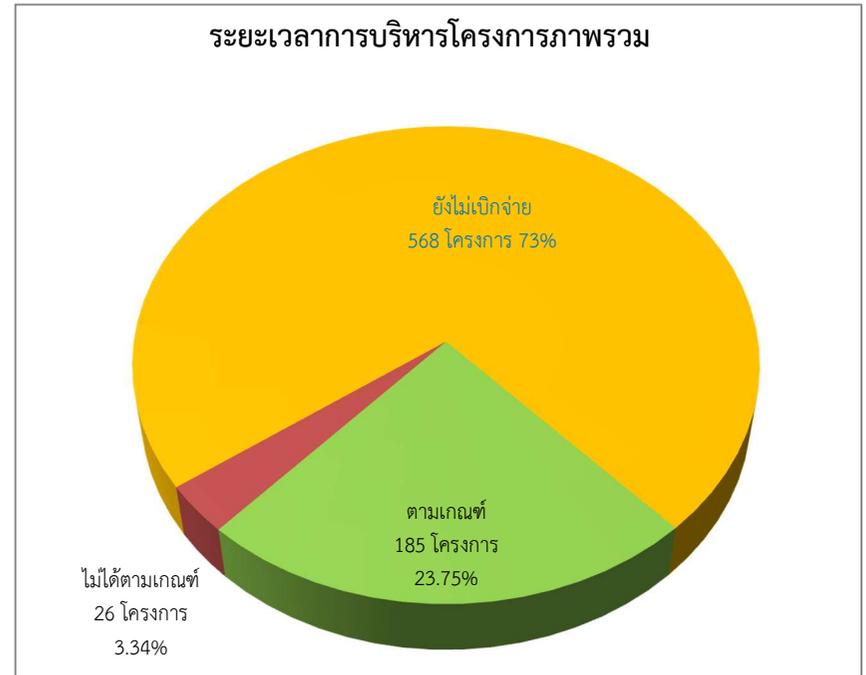

ตาราง แสดงระยะเวลาการบริหารโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชนปี 2561

ภาค	การบริหารโครงการ (55 วัน)	ร้อยละ	อนุฯ เห็นชอบ- ผอ.อนุมัติ (30 วัน)	ผอ.อนุมัติ-เบิกจ่ายงวด แรก (25 วัน)	รวมใช้ระยะเวลา (55 วัน)	จำนวนวันเฉลี่ย
เหนือ (215 คก.)	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 155 โครงการ	72.09	1 - 7 วัน	8 - 45 วัน	9 - 49 วัน	23 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 5 โครงการ	2.33	4 - 7 วัน	55 - 64 วัน	62 - 68 วัน	67 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 55 โครงการ	25.58	ระยะเวลามากที่สุดของโครงการที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 59 วัน			
อีสาน (142 คก.)	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 1 โครงการ	0.70	12 วัน	23 วัน	35 วัน	35 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 10 โครงการ	7.04	14 วัน	58 - 78 วัน	72 - 92 วัน	84 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 131 โครงการ	92.26	ระยะเวลามากที่สุดของโครงการที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 62 วัน			
ใต้ (186 คก.)	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 12 โครงการ	6.45	4 - 13 วัน	30 - 39 วัน	35 - 52 วัน	47 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 3 โครงการ	1.61	13 วัน	46 - 55 วัน	59 - 68 วัน	64 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 171 โครงการ	91.94	ระยะเวลามากที่สุดของโครงการที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 104 วัน			
ก ล า ง ต ะ ว ั น ต ก (181 คก.)	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 9 โครงการ	4.97	14 วัน	22 - 40 วัน	36 - 54 วัน	45 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 5 โครงการ	2.76	14 วัน	48 - 54 วัน	62 - 68 วัน	64 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 167 โครงการ	92.27	ระยะเวลามากที่สุดของโครงการที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 100 วัน			
กท.ตะวันออก (55 คก.)	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 8 โครงการ	14.55	17 วัน	9 - 36 วัน	26 - 53 วัน	40 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 3 โครงการ	5.45	17 วัน	39 - 51 วัน	56 - 68 วัน	63 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 44 โครงการ	80.00	ระยะเวลามากที่สุดของโครงการที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 37 วัน			
รวม (779 คก.)	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 185 โครงการ	23.75	1 - 17 วัน	8 - 45 วัน	9 - 54 วัน	26 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 26 โครงการ	3.34	4 - 17 วัน	39 - 78 วัน	56 - 92 วัน	72 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 568 โครงการ	72.91	ระยะเวลามากที่สุดของโครงการที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 104 วัน			
ระยะเวลาบริหาร โครงการปี 2560 (671 คก.)	การบริหารโครงการ (67 วัน)	ร้อยละ	อนุฯ เห็นชอบ- ผอ.อนุมัติ (20 วัน)	ผอ.อนุมัติ-เบิกจ่ายงวด แรก (47 วัน)	รวมใช้ระยะเวลา (67 วัน)	จำนวนวันเฉลี่ย
	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 408 โครงการ	60.80	1-24 วัน	3-64 วัน	4-67 วัน	45 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 263 โครงการ	39.20	1-30 วัน	51-153 วัน	68 - 183 วัน	98 วัน

3. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก

3.1 ภาพรวมความคืบหน้าสถานะโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก ประกอบด้วย โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก ปีงบประมาณ 2560 วงเงินงบประมาณ 37.50 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2561 วงเงินงบประมาณ 37.50 ล้านบาท มีการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) ดังนี้

3.1.1 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2560 วงเงินงบประมาณ 37,500,000 บาท เดิมมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

- จัดสรรและกระจายกรอบงบประมาณสนับสนุนพื้นที่รูปธรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน 5 ภาคๆ ละ 3,000,000 บาท รวม 15,000,000 บาท
- สนับสนุนการเชื่อมโยงกลุ่มเครือข่ายการผลิต (Cluster) และภาคีความร่วมมือ (ส่วนกลาง) จำนวน 18,750,000 บาท

คณะกรรมการยุทธศาสตร์เศรษฐกิจฐานราก ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 เห็นชอบการปรับกรอบงบประมาณโครงการฯ โดยปรับลดกรอบสนับสนุนการเชื่อมโยงกลุ่มเครือข่ายการผลิต (Cluster) และภาคีความร่วมมือ (ส่วนกลาง) จากจำนวน 18,750,000 บาท คงเหลือ 12,900,000 บาท และให้นำงบประมาณจำนวน 5,850,000 บาท ใช้เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงขบวนองค์กรชุมชนระดับภาค และสนับสนุนการเชื่อมโยงพื้นที่รูปธรรม(Cluster) ระดับจังหวัดและภูมิภาค รวมทั้งจัดทำชุดองค์ความรู้ตามประเด็น(Cluster) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณให้กับภาคต่างๆ ดังนี้

ภาค	สนับสนุนการเชื่อมโยงขบวนองค์กรชุมชน	สนับสนุนการเชื่อมโยงพื้นที่รูปธรรม(Cluster) จังหวัดละ 50,000 บาท	รวมงบประมาณ(บาท)
1. ภาคเหนือ	400,000	15 จังหวัด 750,000	1,150,000
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	400,000	20 จังหวัด 1,000,000	1,400,000
3. ภาคใต้	400,000	14 จังหวัด 700,000	1,100,000
4. ภาคกลางและตะวันตก	400,000	16 จังหวัด 800,000	1,200,000
5. ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	400,000	12 จังหวัด 600,000	1,000,000
รวม	2,000,000	77 จังหวัด 3,850,000	5,850,000

ดังนั้นกรอบงบประมาณจำนวน 37,500,000 บาท ปรับแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์เศรษฐกิจฐานราก ดังนี้

- จัดสรรและกระจายกรอบงบประมาณสนับสนุนพื้นที่รูปธรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน 5 ภาคๆ ละ 3,000,000 บาท รวม 15,000,000 บาท
- งบสนับสนุนการเชื่อมโยงขบวนองค์กรชุมชนระดับภาค (5 ภาค) จำนวน 5,850,000 บาท
- สนับสนุนการเชื่อมโยงกลุ่มเครือข่ายการผลิต (Cluster) และภาคีความร่วมมือ (ส่วนกลาง) จำนวน 12,900,000 บาท

3.1.2 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2561 วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร รวม 37,500,000 บาท มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

ภาค	สนับสนุนตำบลรูปธรรมเศรษฐกิจและทุนชุมชนเฉลี่ยตำบลละ 50,000 บาท	สนับสนุนการเชื่อมโยงพื้นที่รูปธรรม(Cluster)	รวมงบประมาณ(บาท)
1. ภาคเหนือ	5,000,000	1,000,000	6,000,000
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	5,000,000	1,000,000	6,000,000
3. ภาคใต้	5,000,000	1,000,000	6,000,000
4. ภาคกลางและตะวันตก	5,000,000	1,000,000	6,000,000
5. ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	5,000,000	1,000,000	6,000,000
รวม	25,000,000	5,000,000	30,000,000

ทั้งนี้ มีงบสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่าย (Cluster) ระดับชาติ และการสนับสนุนภาคีความร่วมมือ ติดตามและสรุปบทเรียนรูปธรรมความสำเร็จ การเชื่อมโยงเครือข่าย(Cluster) จำนวน 3,750,000 บาท และงบบริหารจัดการ จำนวน 3,750,000 บาท

3.2 สถานะโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก

3.2.1 ภาพรวมสถานะโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก ปี 2560 – 2561 แสดงได้ ดังนี้

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ	จ.งบที่ได้รับอุดหนุน	การอนุมัติและเบิกจ่าย					งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ
		จ.โครงการ	จำนวนตำบล	งบอนุมัติ	งบเบิกจ่าย	งบอนุมัติที่ยังไม่เบิกจ่าย	
2560	37,500,000	256	513	37,500,000	32,772,476	4,727,524	-
2661	37,500,000	266	538	36,561,700	21,516,288	15,045,412	938,300

3.2.2 สถานะโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2560


- จำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติ แก่ชุมชน/เครือข่าย/ภาคี/ส่วนงาน จำนวน 256 โครงการ เป็นเงิน 37,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
- จำนวนงบประมาณที่ได้มีการเบิกจ่าย จากงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติ มีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการแล้วจำนวน 32,772,476 บาท คิดเป็น ร้อยละ 87.39 ของงบอนุมัติ คงเหลืองบประมาณ จำนวน 4,727,524 บาท ที่ยังไม่เบิกจ่าย โดยมีการปิดโครงการและคืนงบประมาณ จำนวน 4,691,524 บาท ดังนั้น คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 36,000 บาท

ทั้งนี้ งบประมาณคงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่ายเป็นงบประมาณที่รับผิดชอบโดยสำนักงานภาคใต้ จำนวน 36,000 บาท ซึ่งสำนักนโยบายและแผน ได้มีบันทึกเลขที่ นผ 07/055 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ส่งถึงสำนักงานภาคใต้ เพื่อดำเนินการตรวจทานและยืนยันงบประมาณคงเหลือในระบบฐานข้อมูลโครงการให้ถูกต้อง และดำเนินการปิดโครงการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 พร้อมส่งเอกสารที่ได้รับการอนุมัติปิดโครงการมาที่สำนักนโยบายและแผน ซึ่งล่วงเลยระยะเวลาแล้ว ขอให้สำนักงานภาคใต้เร่งรัดการดำเนินการ เพื่อดำเนินการปิดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน ปีงบประมาณ 2560 ต่อไป


ตารางแสดงข้อมูลการอนุมัติ การเบิกจ่าย และการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม ProMaps

ที่	ส่วนงาน	กรอบงบ	เสนอขอ. อนุมัติ			งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ	เบิกจ่าย	งบคงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย	บันทึกข้อมูลใน ProMaps		ข้อมูลที่ยังไม่บันทึก	
			จน.โครงการ	จำนวนตำบล	งบอนุมัติ				จน.โครงการอนุมัติ	งบอนุมัติ	โครงการ	งบอนุมัติ
1	ภาคเหนือ	4,150,000	17	100	4,150,000	-	4,150,000	-	17	4,150,000	-	-
2	ภาคอีสาน	4,400,000	101	100	4,400,000	-	4,400,000	-	101	4,400,000	-	-
3	ภาคใต้	4,100,000	15	100	4,100,000	-	4,064,000	36,000	15	4,100,000	-	-
4	ภาคกลางตะวันตก	4,200,000	107	106	4,200,000	-	4,191,000	-	107	4,200,000	-	-
5	ภาคกทม.ฯ ตะวันออก	4,000,000	8	107	4,000,000	-	4,000,000	-	8	4,000,000	-	-
6	ส่วนกลาง	12,900,000	7	-	12,900,000	-	8,217,476	-	7	12,900,000	-	-
7	งบบริหารจัดการ	3,750,000	1	-	3,750,000	-	3,750,000	-	1	3,750,000	-	-
รวม		37,500,000	256	513	37,500,000	-	32,772,476	36,000	256	37,500,000	-	-

แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบ กรอบงบประมาณกับการอนุมัติ และการเบิกจ่าย โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก

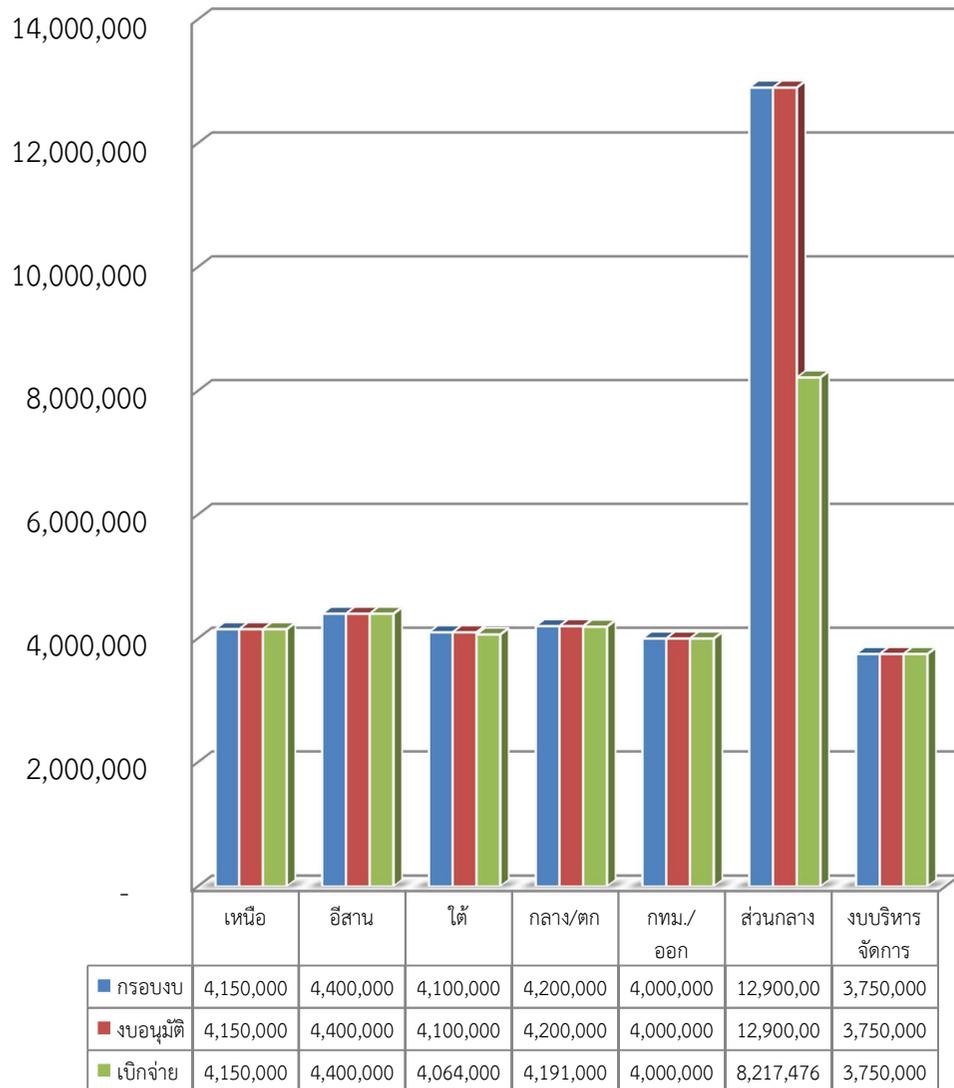

แผนภูมิเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และเดือนมีนาคม 2561 (ยอดเบิกจ่ายสะสม)

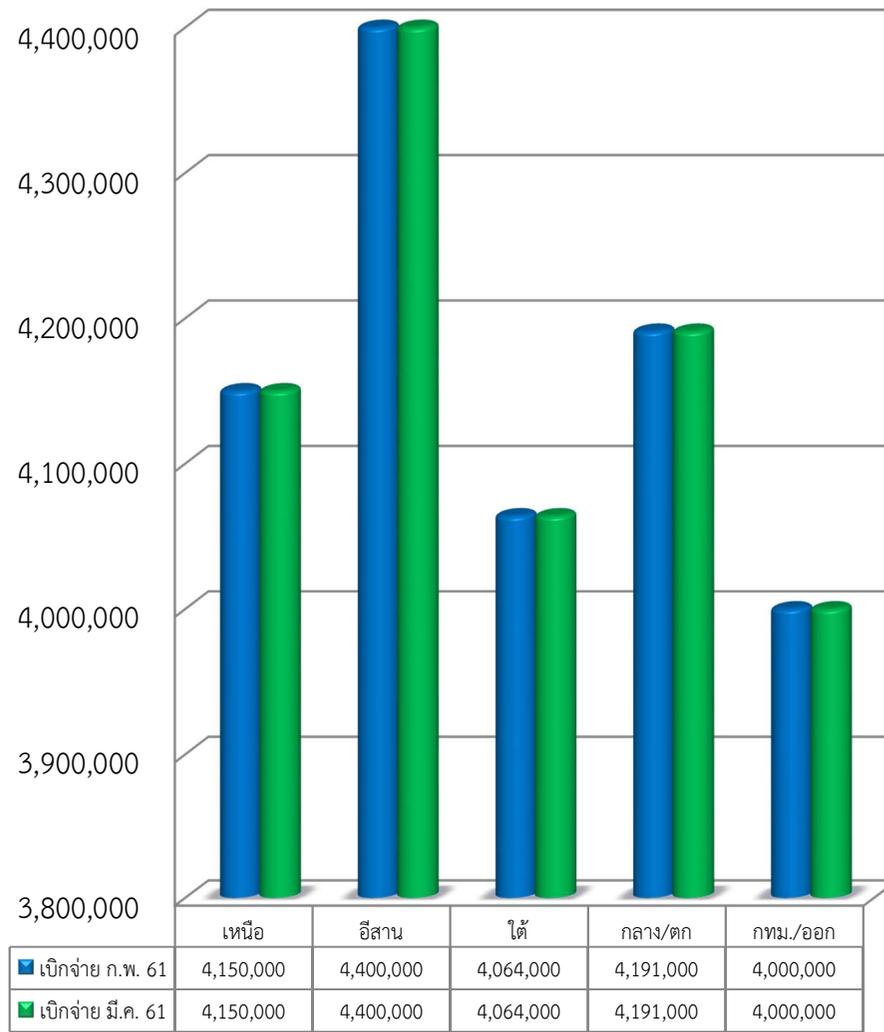

○ การบันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูลโปรแกรม ProMaps

จากการตรวจทานข้อมูลโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2560 ในภาพรวมได้มีการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลโครงการ องค์กร และการแนบไฟล์เอกสาร จากจำนวนโครงการทั้งหมด 256 โครงการ ของ 5 ภาค และโครงการส่วนกลาง

การบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม ProMaps พบว่า มีโครงการที่บันทึกข้อมูลเบื้องต้นไม่สมบูรณ์ ในเรื่อง หมายเลขบัตรประชาชนไม่ครบ 13 หลัก จำนวน 1 โครงการ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ โครงการของจังหวัดเลย และโครงการส่วนกลางยังบันทึกข้อมูลและแนบเอกสารไม่ครบถ้วน

ภาค	จน.โครงการที่อนุมัติ	จน.โครงการที่บันทึก	สถานะข้อมูลที่มีการบันทึก									เอกสารแนบ				
			มติ กก.ภาค/จว.	ข้อมูลโครงการ	ข้อมูลองค์กร	กิจกรรมโครงการ	MOU	จน.พื้นที่รูปธรรม	ข้อมูลโครงการย่อย	บัญชีผู้รับเงิน	แผนการเบิกจ่าย	เอกสารโครงการ	MOU	แบบแสดงผลอนุมัติ	สำเนาบัญชี	แผนการใช้เงิน
1.เหนือ	17	17	17	17	17	17	17	100	0	17	17	17	17	17	17	17
2.อีสาน	101	101	101	100	101	101	101	100	0	101	101	101	101	101	101	101
3.ใต้	15	15	15	15	15	15	15	100	0	15	15	15	15	15	15	15
4.กลางตะวันตก	107	107	107	107	107	107	107	106	0	107	107	107	107	107	107	107
5.กทม.ตะวันออก	8	8	8	8	8	8	8	107	107	8	8	8	8	8	8	8
6.ส่วนกลาง*	8	8	7	7	7	7	1		0	1	3	2	0	7	0	2
รวม (คิดเป็นร้อยละ)	256	256	255	254	255	255	249	513	107	249	251	250	248	255	248	250
		100.00	99.61	99.22	99.61	99.61	97.27			97.27	98.05	97.66	96.88	99.61	96.88	97.66

*หมายเหตุ : โครงการส่วนกลาง เบิกจ่ายจากระบบโปรแกรมบริหารการเงิน EFS ซึ่งข้อมูลในระบบดังกล่าว ยังไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ Pro Maps


3.2.3 สถานะโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2561

- จำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติ แก่ชุมชน/เครือข่าย/ภาคี/ส่วนงาน จำนวน 266 โครงการ เป็นเงิน 36,561,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.50 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
- จำนวนงบประมาณคงเหลือที่ยังไม่ได้อนุมัติ จำนวน 938,300 บาท ขอให้ส่วนกลางและสำนักงานภาคกรุงเทพมหานครและตะวันออก เร่งรัดการพัฒนาโครงการเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ


- จำนวนงบประมาณที่ได้มีการเบิกจ่าย จากงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติ มีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการแล้วจำนวน 21,516,288 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.85 ของงบอนุมัติ คงเหลืองบประมาณ จำนวน 15,045,412 บาท ที่ยังไม่เบิกจ่าย ขอให้สำนักงานภาคเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณงวดที่ 1 ภายในระยะเวลา 4 เดือนนับจากวันที่ได้รับอนุมัติโครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่เหลือภายในวันที่ 30 กันยายน 2561
- ข้อสังเกต : สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการในระบบ Pro Maps ให้ครบถ้วนตามจำนวนโครงการที่ ผอ.ได้อนุมัติ

ที่	ส่วนงาน	กรอบงบ	เสนอผอ. อนุมัติ			งบคงเหลือ ที่ยังไม่ อนุมัติ	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ ที่ยังไม่ เบิกจ่าย	บันทึกข้อมูลใน ProMaps		ข้อมูลที่ยังไม่บันทึก	
			จน. โครงการ	จำนวน ตำบล	งบอนุมัติ				จน.โครงการ อนุมัติ	งบอนุมัติ	โครงการ	งบอนุมัติ
1	ภาคเหนือ	6,000,000	16	108	6,000,000	-	4,200,000	1,800,000	16	6,000,000	-	-
2	ภาคอีสาน	6,000,000	101	100	6,000,000	-	2,599,000	3,401,000	76	5,000,000	25	1,000,000
3	ภาคใต้	6,000,000	105	100	6,000,000	-	3,752,000	2,248,000	105	6,000,000		
4	ภาคกลางตะวันตก	6,000,000	17	112	6,000,000	-	2,730,000	3,270,000	17	6,000,000	-	-
5	ภาคกทม.ฯ ตะวันออก	6,000,000	25	118	5,640,000	360,000	3,066,000	2,574,000	25	5,640,000		
6	ส่วนกลาง	3,750,000	2	-	3,171,700	578,300	1,419,288	1,752,412	2	3,171,700	-	-
7	งบบริหารจัดการ	3,750,000	-	-	3,750,000	-	3,750,000	-		3,750,000	-	-
	รวม	37,500,000	266	538	36,561,700	938,300	21,516,288	15,045,412	241	35,561,700	25	1,000,000

แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบ กรอบงบประมาณกับการอนุมัติ และการเบิกจ่าย โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก ปี 2561

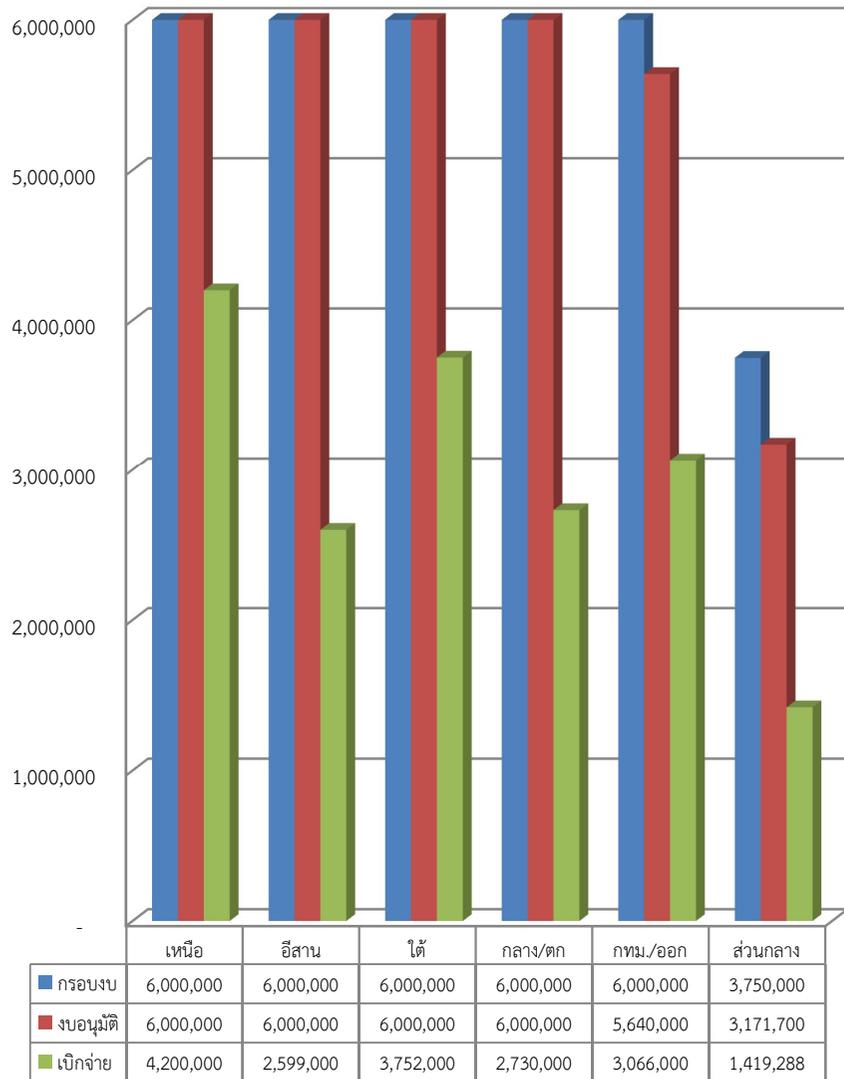

แผนภูมิเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และเดือนมีนาคม 2561 (ยอดเบิกจ่ายสะสม)

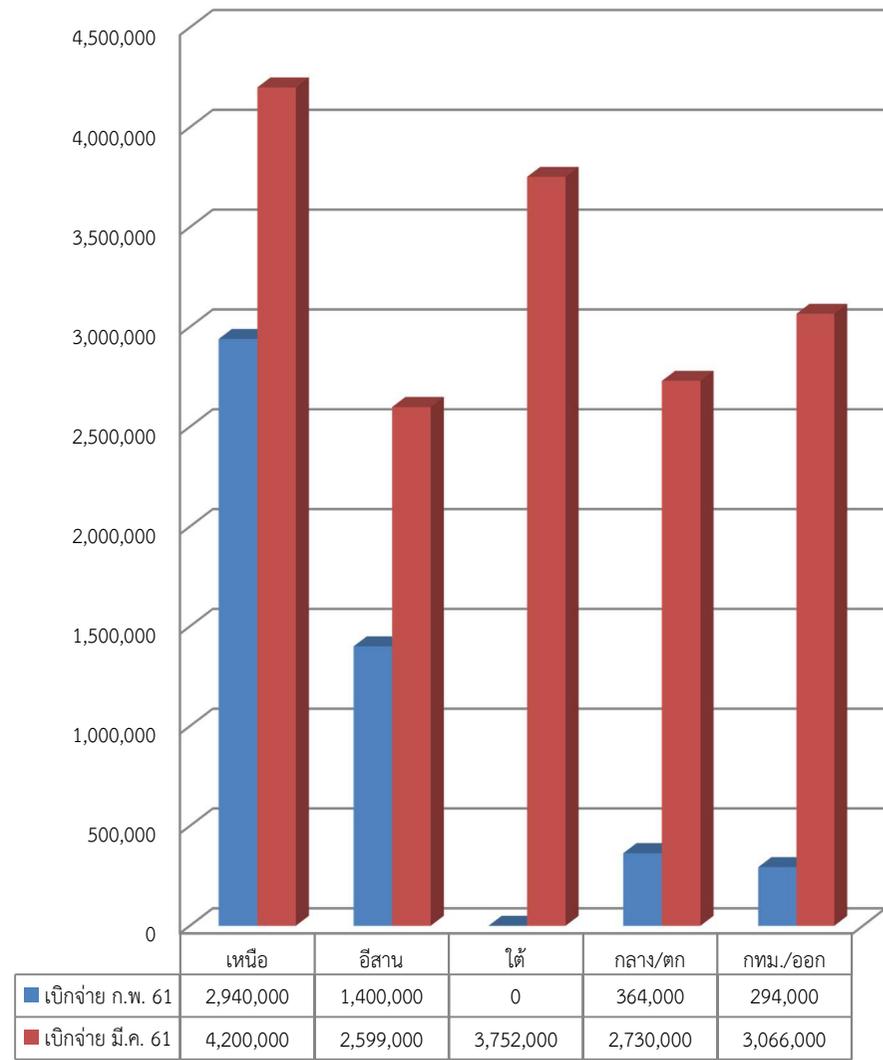

○ การบันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูลโปรแกรม ProMaps

จากการตรวจทานข้อมูลโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2561 ในภาพรวมได้มีการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลโครงการ องค์กร และการแนบไฟล์เอกสาร จากจำนวนโครงการทั้งหมด 266 โครงการของ 5 ภาค และโครงการส่วนกลาง พบว่า มีการบันทึกข้อมูลจำนวน 241 โครงการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังบันทึกจำนวนโครงการในระบบไม่ครบถ้วนตามที่ผอ.อนุมัติ) และข้อมูลมีความครบถ้วนเฉลี่ยร้อยละ 73.18

ทั้งนี้ ภาคที่ยังบันทึกข้อมูลโครงการไม่ครบถ้วน รวมทั้งการแนบไฟล์เอกสารในระบบตามเงื่อนไขและข้อตกลง ได้แก่ เอกสารโครงการ หนังสือบันทึกความร่วมมือแบบแสดงผลอนุมัติ สำเนาบัญชี และแผนการใช้เงิน ซึ่งข้อมูลที่ได้มีการบันทึกในระบบจะนำไปสู่การตรวจสอบของหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร และการประมวลผลข้อมูลภาพรวมโครงการต่อไป จึงขอให้สำนักงานภาคดำเนินการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมถึงแนบรายชื่อตำบลและงบประมาณที่แต่ละตำบลได้รับ และระบุกิจกรรมรูปธรรมตำบลนั้นๆ ในระบบด้วย

ภาค	จน.โครงการที่อนุมัติ	จน.โครงการที่บันทึก	สถานะข้อมูลที่มีการบันทึก									เอกสารแนบ				
			มติ กก.ภาค/จว.	ข้อมูลโครงการ	ข้อมูลองค์กร	กิจกรรมโครงการ	MOU	จน.ตำบล	ข้อมูลโครงการย่อย	บัญชีผู้รับเงิน	แผนการเบิกจ่าย	เอกสารโครงการ	MOU	แบบแสดงผลอนุมัติ	สำเนาบัญชี	แผนการใช้เงิน
1.เหนือ	16	16	16	16	10	16	16	108	0	16	16	14	12	12	12	12
2.อีสาน	101	76	76	74	61	76	62	53	0	64	65	32	13	13	13	13
3.ใต้	105	105	105	103	101	102	98	100	0	98	98	97	97	97	97	97
4.กลางตะวันตก	17	17	17	16	17	17	17	112	16	17	17	0	9	9	9	9
5.กทม.ตะวันออกเฉียง	25	25	16	25	24	25	25	110	8	23	23	16	16	16	16	15
6.ส่วนกลาง*	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	1	2	0	2	0	0
รวม	266	241	241	236	215	238	218	483	24	218	220	161	147	149	147	146
(คิดเป็นร้อยละ)		90.60	90.60	88.72	80.83	89.47	81.95		9.02	81.95	82.71	60.53	55.26	56.02	55.26	54.89

*หมายเหตุ : โครงการส่วนกลาง เบิกจ่ายจากระบบโปรแกรมบริหารการเงิน EFS ซึ่งข้อมูลในระบบดังกล่าว ยังไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ Pro Maps

3.3 ระยะเวลาในกระบวนการบริหารโครงการ ตามมาตรฐานการบริหารโครงการ กำหนดระยะเวลาการบริหารโครงการตั้งแต่โครงการรับการพิจารณาอนุมัติจากคณะทำงานพิจารณาโครงการระดับภาค จนกระทั่งเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกให้กับองค์กรที่ได้รับการอนุมัติ รวม 55 วัน โดยแยกเป็น 1) กระบวนการพิจารณาโครงการ ตั้งแต่คณะทำงานพิจารณาโครงการระดับภาคพิจารณาเห็นชอบโครงการจนถึง ผอ. ภาคลงนามอนุมัติ จำนวน 30 วัน และ 2) กระบวนการเบิกจ่ายโครงการหลังจาก ผอ. ภาคลงนามอนุมัติ จนถึงการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก จำนวน 20 วัน

การบริหารโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานรากปี 2561

จำนวน 241 โครงการ พบว่า

- มีโครงการที่สามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 99 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 41.08 ของโครงการทั้งหมด โดยใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 39 วัน
- มีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 95 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 39.42 ของโครงการทั้งหมด โดยใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 78 วัน
- มีโครงการที่ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก จำนวน 47 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคกลางและตะวันตก และภาคกรุงเทพฯและตะวันออก คิดเป็นร้อยละ 19.50 ของโครงการทั้งหมด โดยมีระยะเวลาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกนานสุด 105 วัน


จึงขอให้ภาคดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมทั้งตรวจสอบปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้า เพื่อนำมาวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาและการออกแบบการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพในอนาคต

ข้อสังเกต : โครงการที่สามารถใช้ระยะเวลาตามเกณฑ์ 55 วัน จำนวน 99 โครงการ มีระยะเวลาในแต่ละกระบวนการ ดังนี้

- 1) กระบวนการพิจารณาโครงการ ระยะเวลาในการบริหารโครงการตั้งแต่คณะทำงานพิจารณาโครงการระดับภาคพิจารณาเห็นชอบโครงการจนถึง ผอ.ภาคลงนามอนุมัติ จำนวน 30 วัน : สามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐาน ใช้เวลานานสุด 17 วัน
- 2) กระบวนการเบิกจ่ายโครงการ : ระยะเวลาหลังจาก ผอ.ภาคลงนามอนุมัติ จนถึงการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก จำนวน 25 วัน : โดยส่วนมากใช้ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ใช้เวลานานสุด 49 วัน

ตาราง แสดงระยะเวลาการบริหารโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก ปี 2561

ภาค	การบริหารโครงการ	ร้อยละ	ระยะเวลาตามมาตรฐานการบริหารโครงการ		รวมใช้ระยะเวลา (55 วัน)	จำนวนวันเฉลี่ย
			อนุฯ พิจารณา - ผอ.อนุมัติ (30 วัน)	ผอ.อนุมัติ-เบิกจ่ายงวดแรก(25 วัน)		
เหนือ (16 โครงการ)	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 10 โครงการ		4 - 7 วัน	11 - 46 วัน	15 - 50 วัน	37 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 6 โครงการ		4 - 7 วัน	56 - 94 วัน	63 - 98 วัน	71 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย - โครงการ		-		-	

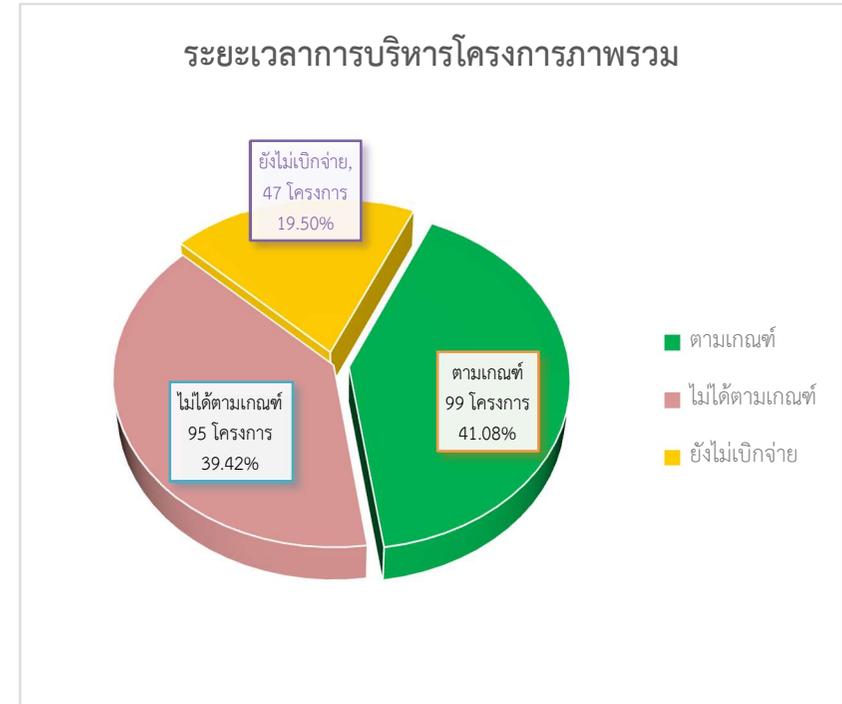

อีสาน (76 โครงการ)	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 1 โครงการ		12 วัน	33 วัน	45 วัน	45 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 43 โครงการ		44 วัน	19 - 49 วัน	63 - 93 วัน	78 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 32 โครงการ		44 วัน	ระยะเวลาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 96 วัน		
ใต้ (105 โครงการ)	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 66 โครงการ		4 - 13 วัน	23 - 49 วัน	28 - 53 วัน	33 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 31 โครงการ		4 - 13 วัน	45 - 82 วัน	58 - 95 วัน	66 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 8 โครงการ		8 - 13 วัน	ระยะเวลาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 105 วัน		
กลางตะวันตก (17 โครงการ)	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 8 โครงการ		13 วัน	22 - 40 วัน	35 - 53 วัน	44 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 7 โครงการ		13 วัน	46 - 51 วัน	59 - 74 วัน	66 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 2 โครงการ		13 วัน	ระยะเวลาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 101 วัน		
กทม.ตะวันออก (25 โครงการ)	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 13 โครงการ		14 - 17 วัน	9 - 36 วัน	26 - 53 วัน	43 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 7 โครงการ		17 วัน	39 - 51 วัน	56 - 68 วัน	65 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 5 โครงการ		14 วัน	ระยะเวลาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 53 วัน		
ส่วนกลาง (2 โครงการ)	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 1 โครงการ		10 วัน	22 วัน	32 วัน	32 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 1 โครงการ		10 วัน	112 วัน	122 วัน	122 วัน
รวม (241 โครงการ)	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 99 โครงการ	41.08	4 - 17 วัน	9 - 49 วัน	15 - 53 วัน	39 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 95 โครงการ	39.42	4 - 44 วัน	19 - 112 วัน	56 - 122 วัน	78 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 47 โครงการ	19.50	8 - 14 วัน	ระยะเวลาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 53 - 105 วัน		

ระยะเวลาการบริหารโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก ปี 2560

ระยะเวลาการบริหาร โครงการปี 2560 จำนวน 256 คก.	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 115 โครงการ	44.92	1 - 16 วัน	21 - 47 วัน	1 - 47 วัน	49 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 140 โครงการ	54.69	6 - 72 วัน	48 - 155 วัน	6 - 155 วัน	96 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 1 โครงการ	0.39	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขบวนองค์กรชุมชนกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาพื้นที่รูปธรรมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผอ. อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2559 ซึ่งล่วงเลยระยะเวลาโครงการปีงบประมาณ 2560 แล้ว สำนักงานยุทธศาสตร์ฯขออนุมัติปิดโครงการตามหนังสือ เลขที่ ยช33/1370 ลงวันที่ 20 กันยายน 2560 เรื่อง ขออนุมัติปิดโครงการ			
